Apostila do Consultor de Implantação

Guia completo para conduzir implantações do Faktory Flow com método, clareza e autonomia.

Versão 1.0 · Material de uso interno

Público-alvo Consultores de implantação, novos colaboradores e estagiários

Última atualização 2025

FICHA TÉCNICA

Sobre esta Apostila

Informações gerais sobre o material, seu propósito e como utilizá-lo durante a implantação.

PROPÓSITO

Esta apostila tem como objetivo capacitar consultores de implantação a compreender os processos de negócio dos clientes, conduzir treinamentos com autonomia, orientar usuários, identificar riscos e diagnosticar problemas antes de encaminhar chamados. O foco é o **processo de negócio**, não apenas a funcionalidade do sistema.

A QUEM SE DESTINA

- Consultores de implantação do Faktory Flow
- Novos colaboradores em treinamento
- Estagiários e profissionais em formação
- Usuários de empresas clientes que precisam compreender o fluxo de implantação

COMO USAR

- Leia a Parte I e Parte II antes de iniciar qualquer implantação
- Consulte os módulos da Parte V conforme o escopo contratado
- Use a Biblioteca de Processos (Parte VII) como referência durante o dia a dia
- Utilize as seções de anotações ao final de cada parte para registrar observações pessoais

ESTRUTURA DO MATERIAL

- **Parte I** — A Implantação: conceitos, papel do consultor e responsabilidades
- **Parte II** — O Método Faktory: as 7 etapas padronizadas
- **Parte V** — Os Módulos: descrição funcional de cada módulo
- **Parte VI** — Estudo de Caso: implantação completa (em elaboração)
- **Parte VII** — Biblioteca de Processos e Diagnóstico de Problemas

CONTROLE DE VERSÃO

Versão 1.0 — 2025 · Versão inicial otimizada, com fluxos impressos e checklists revisados.

SUMÁRIO

Índice de Conteúdo

I A Implantação 4

1 O que é implantar o Faktory Flow 4
2 O papel do consultor 4
3 Conhecendo o cliente e suas responsabilidades 4
4 Como conduzir o projeto 5

II O Método Faktory 6

1 Reunião de Alinhamento (RA) 6
2 Configuração do ambiente 6
3 Definição do cronograma 7
4 Treinamentos 7
5 Preparação para o Go-live 7
6 Go-live 7
7 Encerramento da implantação 7

V Os Módulos do Faktory Flow 8

1 Vendas 9
2 Faturamento 9
3 Financeiro 10
4 CRM 10
5 Produção 11
6 Compras 11
7 Recebimento 12
8 Estoque 12
9 Expedição 12
10 Serviços e Instalação 13
11 Projetos e Obras 13
12 Fiscal 14
13 Relatórios e Análises 14
14 Tarefas 15
15 Alumina (IA) 15

VI Estudo de Caso 16

VII Biblioteca de Processos e Diagnóstico 17

1 Biblioteca de Processos 17
2 Biblioteca de Problemas — Diagnóstico 20

— Conclusão do Guia 21

PARTE I

A Implantação

O que é implantar, o papel do consultor, as responsabilidades do cliente e como conduzir o projeto.

1. O que é implantar o Faktory Flow

O Faktory Flow centraliza e integra os processos da empresa em um único ambiente. A implantação **não é apenas instalar o sistema** — é preparar a empresa para usá-lo com autonomia.

ETAPA	O QUE ACONTECE
Reunião de Alinhamento	Conhecer o cliente e definir o projeto
Configuração do ambiente	Garantir acessos e pré-requisitos técnicos
Cronograma	Organizar datas, módulos e participantes
Treinamentos	Ensinar processos, não apenas telas
Preparação para o Go-live	Validar cadastros, acessos e fluxos
Go-live	Entrada em produção assistida
Encerramento	Formalizar a conclusão e migrar para o Suporte

REGRA DE OURO

Cada etapa depende da conclusão da anterior. Não antecipe atividades sem os pré-requisitos prontos.

2. O papel do consultor

Você é um **facilitador**, não um instrutor de telas. Seu trabalho é traduzir a realidade do cliente para dentro do sistema.

O que você FAZ

- Compreende os processos do cliente antes de treinar
- Organiza etapas e registra decisões
- Identifica riscos e pendências com responsáveis e prazos
- Desenvolve a autonomia dos usuários
- Diferencia erro de parametrização, falha operacional e bug

O que você NÃO FAZ

- Não promete funcionalidades que não existem
- Não decide regras internas, fiscais ou contábeis pelo cliente
- Não assume responsabilidades que pertencem à gestão da empresa

ATENÇÃO

Questões fiscais (NCM, CFOP, CST, tributação) devem ser validadas **pelo cliente e seu contador**. Você orienta, não decide.

3. Conhecendo o cliente e suas responsabilidades

A **Reunião de Alinhamento (RA)** é o momento para entender o cenário.

O que levantar na RA

- Atividade principal da empresa
- Processo comercial
- Módulos contratados
- Integrações (CEM Desktop, Mobi)
- Como emitem Nota Fiscal hoje
- Como controlam o financeiro
- Responsáveis pelo projeto

Papéis do cliente


PAPEL	RESPONSABILIDADE
Sponsor	Apoio e decisões estratégicas
Gerente de Projetos	Acompanha cronograma, centraliza decisões, administra horas
Key User	Conhece os processos, participa das validações, é referência para os demais

ANOTAÇÕES

4. Como conduzir o projeto

A condução segue uma ordem lógica. Cada etapa prepara a próxima.

Ordem lógica da condução

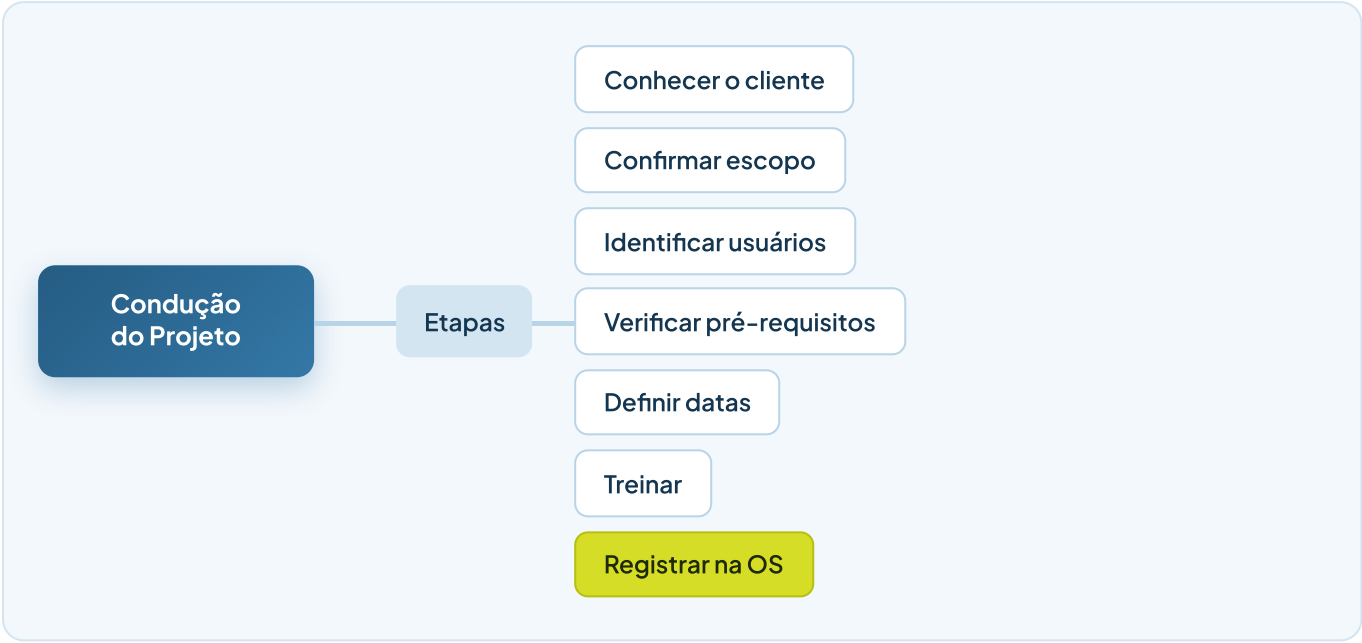

Princípios de condução

- Ensine **processos**, não funcionalidades
- Mostre o **impacto** de cada ação nos módulos seguintes
- Use exemplos da rotina do cliente
- Uma etapa só termina quando o cliente **compreende, executa e valida**

EXEMPLO PRÁTICO

Um pedido de venda gera nota fiscal e títulos no Contas a Receber. Por isso, Vendas, Faturamento, Fiscal e Financeiro devem ser treinados de forma conectada.

Preparação para as próximas etapas

Antes de ensinar o sistema, o consultor precisa compreender o projeto que está conduzindo. O Faktory Flow é a ferramenta utilizada para organizar os processos da empresa, mas é a atuação do consultor, em conjunto com o envolvimento do cliente, que transforma essa ferramenta em uma solução realmente aplicada à rotina do negócio.

ANOTAÇÕES


PARTE II

O Método Faktory

Sequência padronizada de implantação. Cada etapa possui objetivo específico e depende da conclusão da etapa anterior.

SEQUÊNCIA OBRIGATÓRIA

O consultor deve respeitar a ordem da implantação e evitar antecipar atividades que ainda não possuem os pré-requisitos necessários.

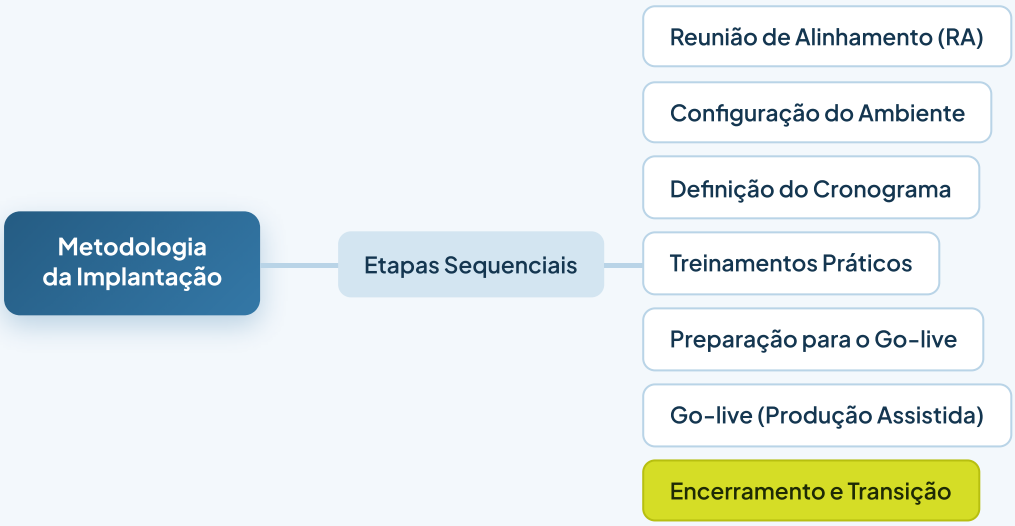

1. Reunião de Alinhamento (RA)

Início oficial do projeto. Seu principal objetivo é conhecer o cliente, apresentar a metodologia da Faktory, alinhar expectativas e definir como a implantação será conduzida.

O que apresentar: escopo contratado, etapas do projeto, papel de cada participante, atendimentos, registros em Ordem de Serviço, reagendamentos e transição para o Suporte.

2. Configuração do ambiente

Garantir que toda a estrutura necessária para os treinamentos esteja pronta.

- [ ] Acesso ao Faktory Flow
- [ ] Usuários cadastrados e permissões corretas
- [ ] Internet estável
- [ ] Ferramenta de acesso remoto instalada
- [ ] Agent Faktory configurado (se utilizar CEM Desktop)


ATENÇÃO

Se algum pré-requisito não estiver pronto, resolva **antes** de iniciar os treinamentos.

3. Definição do cronograma

Organizar a implantação — quais módulos, em qual ordem, com quais usuários e quais objetivos.

Sequência lógica recomendada



4. Treinamentos

Etapa de maior interação entre consultor e cliente. Mais do que apresentar funcionalidades, o consultor deve **ensinar processos**. O cliente precisa compreender:

- Quando utilizar determinada função
- Por que utilizá-la
- Quais informações são obrigatórias
- Quais impactos aquela ação gera nos demais módulos

5. Preparação para o Go-live

Antes da entrada em produção, é necessário validar que a empresa está preparada para utilizar o sistema em sua operação diária.

- [ ] Principais cadastros realizados
- [ ] Usuários com acesso ao sistema
- [ ] Processos testados
- [ ] Configurações fiscais revisadas
- [ ] Fluxos financeiros validados
- [ ] Integrações previstas funcionando

O objetivo não é eliminar todas as dúvidas, mas garantir que o cliente possua segurança para iniciar a utilização do sistema.

6. Go-live

Momento em que a empresa passa a utilizar o Faktory Flow como seu sistema oficial. Normalmente, os primeiros dias geram dúvidas, ajustes e validações adicionais. Por isso, a metodologia prevê uma **entrada em produção assistida**.

7. Encerramento da implantação

A implantação é considerada concluída quando os objetivos definidos foram alcançados e o cliente está apto a utilizar o sistema em sua rotina.

Antes de finalizar o projeto

- [ ] Revisar todas as pendências
- [ ] Confirmar que os treinamentos previstos foram realizados
- [ ] Garantir que as Ordens de Serviço estejam aprovadas
- [ ] Formalizar a conclusão junto ao cliente

IMPORTANTE

Após o encerramento, dúvidas operacionais passam para o **Suporte**. Novos acompanhamentos consultivos exigem nova carga de horas.

MÉTRICA DE SUCESSO

O sucesso não é medido pela quantidade de reuniões realizadas, mas pela **capacidade do cliente de usar o Faktory Flow com autonomia, segurança e confiança**.

ANOTAÇÕES

PARTE V

Os Módulos do Faktory Flow

Embora cada módulo possua características específicas, todos fazem parte de um único fluxo operacional. Os treinamentos devem ser conduzidos de forma integrada.

ORDEM DE IMPLANTAÇÃO

Os primeiros módulos a serem implantados são **Vendas → Faturamento → Fiscal → Financeiro**. Os demais seguem conforme o escopo contratado e a necessidade de cada cliente.

Estrutura de cada módulo neste guia

SEÇÃO	O QUE CONTÉM
Objetivo do módulo	Finalidade e importância dentro do Faktory Flow
Papel na operação	Como o módulo se integra aos demais processos
Quando implantar	Fase do projeto em que o treinamento deve ocorrer
Fluxo operacional	Sequência recomendada de utilização
Condução do treinamento	Orientações para apresentar o processo
Boas práticas	Recomendações para reduzir retrabalhos
Checklist de validação	Pontos a confirmar antes de considerar implantado

Os módulos a seguir são apresentados em blocos padronizados. Consulte cada um conforme o escopo contratado.

1. Vendas

OBJETIVO

Gerenciar o processo comercial, da criação do pedido ao faturamento. Integrado ao CEM, importa orçamentos sem redigitação.


PAPEL NA OPERAÇÃO

Inicia o fluxo operacional. Alimenta Faturamento, Fiscal, Financeiro, Produção e Expedição.

QUANDO IMPLANTAR

Após configuração dos cadastros básicos e, preferencialmente, com integração CEM configurada.

FLUXO OPERACIONAL

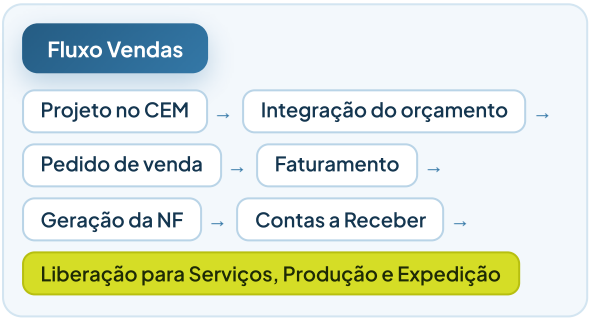

CONDUÇÃO DO TREINAMENTO

Priorize exemplos reais da empresa. O fluxo pode ser adaptado (ex: usar status "Encerrado" e gerar títulos antes do "Faturado"). O importante é que os usuários compreendam a lógica do processo.

BOAS PRÁTICAS

- Validar dados importados antes da aprovação
- Explicar a importância dos status do pedido
- Demonstrar faturamento parcial quando aplicável
- Relacionar sempre aos demais módulos

CHECKLIST DE VALIDAÇÃO

- [ ] Importar orçamento do CEM (quando aplicável)
- [ ] Cadastrar e aprovar pedido de venda
- [ ] Realizar faturamento
- [ ] Compreender integração com Faturamento, Financeiro, Serviços, Produção e Expedição

2. Faturamento

OBJETIVO

Emitir documentos fiscais (NF-e/NFS-e), transmitir aos órgãos fiscais e integrar com Financeiro, Estoque e Expedição.


PAPEL NA OPERAÇÃO

Conecta a área comercial às etapas fiscais e operacionais.

QUANDO IMPLANTAR

Após o módulo de Vendas e configuração das regras fiscais (CFOP, NCM, impostos, certificado digital).

FLUXO OPERACIONAL

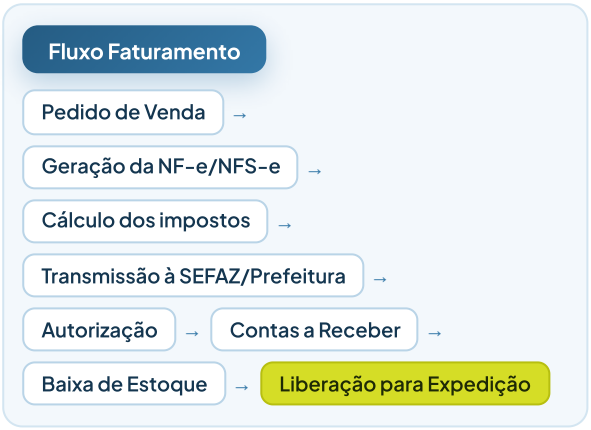

BOAS PRÁTICAS

- Validar configurações fiscais antes dos testes
- Conferir certificado digital e validade
- Orientar sobre impactos da autorização e cancelamento
- Demonstrar integração com Financeiro, Estoque e Expedição

CHECKLIST DE VALIDAÇÃO

- [ ] Gerar NF-e ou NFS-e a partir de um pedido
- [ ] Transmitir e acompanhar retorno da autorização
- [ ] Emitir DANFE e XML
- [ ] Realizar carta de correção e cancelamento (quando aplicável)
- [ ] Compreender impactos nos módulos Financeiro, Estoque e Expedição

3. Financeiro

OBJETIVO

Gerenciar movimentações financeiras — contas a receber, contas a pagar, cobranças, pagamentos, conciliação bancária e fluxo de caixa.


PAPEL NA OPERAÇÃO

Recebe informações de Vendas, Faturamento, Compras e Recebimento. Elimina lançamentos manuais.

QUANDO IMPLANTAR

Após Vendas, Faturamento e configurações financeiras (plano de contas, contas bancárias, meios e condições de pagamento).

FLUXO OPERACIONAL

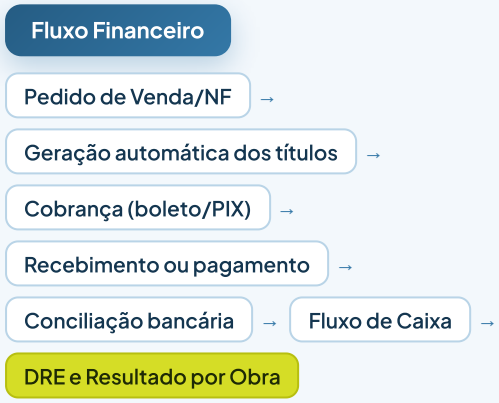

BOAS PRÁTICAS

- Configurar contas bancárias, plano de contas e meios de pagamento antes de operar
- Incentivar geração automática de títulos
- Demonstrar importância da conciliação e fluxo de caixa
- Orientar uso dos demonstrativos para decisões

CHECKLIST DE VALIDAÇÃO

- [ ] Consultar contas a receber e a pagar
- [ ] Realizar recebimentos e pagamentos
- [ ] Consultar fluxo de caixa e demonstrativos
- [ ] Compreender integração com Vendas, Faturamento, Compras e Recebimento

4. CRM

OBJETIVO

Gerenciar o relacionamento com clientes, do primeiro contato ao pós-venda.


PAPEL NA OPERAÇÃO

Porta de entrada do processo comercial. Oportunidades são convertidas em pedidos de venda.

QUANDO IMPLANTAR

Antes do módulo de Vendas.

FLUXO OPERACIONAL



CHECKLIST DE VALIDAÇÃO

- [ ] Cadastrar contato ou oportunidade
- [ ] Movimentar oportunidades no funil
- [ ] Registrar atividades e acompanhamentos
- [ ] Converter oportunidade em pedido de venda
- [ ] Consultar histórico e visão do cliente

5. Produção

OBJETIVO

Transformar pedidos de venda em ordens de produção, organizando planejamento, consumo de materiais e etapas produtivas.

QUANDO IMPLANTAR

Após Vendas e Estoque.

FLUXO OPERACIONAL

Fluxo Produção

Pedido de Venda →
Ordem de Produção →
Planejamento →
Separação de Materiais →
Produção →
Apontamento das Etapas →
Conclusão da Ordem →
Liberação para Instalação ou Expedição

CHECKLIST DE VALIDAÇÃO

- [ ] Gerar ordem de produção a partir de pedido
- [ ] Planejar e acompanhar produção
- [ ] Realizar apontamentos das etapas
- [ ] Consultar andamento das ordens
- [ ] Compreender integração com Vendas, Estoque, Compras e Expedição

6. Compras

OBJETIVO

Gerenciar aquisição de materiais — cotações, comparação de fornecedores, pedidos e acompanhamento de entregas.

QUANDO IMPLANTAR

Após Estoque e Produção.

FLUXO OPERACIONAL

Fluxo Compras

Necessidade de Compra →
Cotação →
Comparação de Fornecedores →
Pedido de Compra →
Acompanhamento da Entrega →
Recebimento da Mercadoria

CHECKLIST DE VALIDAÇÃO

- [ ] Gerar solicitação de compra
- [ ] Realizar cotação com fornecedores
- [ ] Emitir pedido de compra
- [ ] Acompanhar entrega dos materiais
- [ ] Compreender integração com Produção, Recebimento, Financeiro e Estoque

7. Recebimento

OBJETIVO

Controlar entrada de mercadorias — importação da NF do fornecedor, conferência e integração com Estoque, Compras, Financeiro e Fiscal.

QUANDO IMPLANTAR

Após Compras.

CHECKLIST DE VALIDAÇÃO

- [ ] Importar NF de fornecedor
- [ ] Conferir itens recebidos
- [ ] Registrar divergências ou avarias
- [ ] Finalizar recebimento
- [ ] Compreender integração com Compras, Estoque, Financeiro e Fiscal

8. Estoque

OBJETIVO

Controlar movimentação de materiais. No Faktory Flow, o estoque é controlado por características (cor, largura, altura, comprimento), ideal para esquadrias.

QUANDO IMPLANTAR

Após configuração dos cadastros de produtos e antes de Compras, Produção e Recebimento.

FLUXO OPERACIONAL



CHECKLIST DE VALIDAÇÃO

- [ ] Consultar saldos dos produtos
- [ ] Realizar movimentações e transferências
- [ ] Entender reservas de materiais
- [ ] Executar inventários e ajustes
- [ ] Compreender integração com Compras, Recebimento, Produção, Vendas e Faturamento

9. Expedição

OBJETIVO

Organizar a entrega dos produtos — montagem da carga, conferência, carregamento e transporte.

QUANDO IMPLANTAR

Após Vendas, Faturamento, Produção e Estoque.

CHECKLIST DE VALIDAÇÃO

- [ ] Montar carga com pedidos faturados
- [ ] Realizar conferência e carregamento
- [ ] Acompanhar status das entregas
- [ ] Registrar confirmação de recebimento
- [ ] Compreender integração com Vendas, Estoque, Produção e Faturamento

10. Serviços e Instalação

REVER

OBJETIVO

Controlar atividades fora da fábrica — medição em obra, instalação, vistoria e assistência técnica.

QUANDO IMPLANTAR

Após Vendas, Produção e Expedição.

FLUXO OPERACIONAL



CHECKLIST DE VALIDAÇÃO

- [ ] Realizar medição em obra e registrar informações
- [ ] Comparar medidas com o pedido vendido
- [ ] Organizar agenda das equipes
- [ ] Registrar checklist, fotos e aceite
- [ ] Realizar vistoria e abertura de assistência técnica
- [ ] Consultar histórico
- [ ] Compreender integração com Vendas, Produção, Expedição, Faturamento e Projetos

11. Projetos e Obras

REVER

OBJETIVO

Centralizar informações das obras — do planejamento à conclusão. Transforma cada obra em centro de controle e resultado.

QUANDO IMPLANTAR

Após Vendas, Compras, Produção, Estoque e Financeiro.

CHECKLIST DE VALIDAÇÃO

- [ ] Criar e configurar nova obra
- [ ] Organizar fases e etapas
- [ ] Planejar necessidades de materiais
- [ ] Acompanhar compras, produção, estoque e serviços
- [ ] Consultar receitas, custos e margem
- [ ] Usar diário de obra
- [ ] Identificar diferenças entre previsto e realizado
- [ ] Compreender integração com Vendas, Compras, Produção, Estoque, Financeiro, Serviços e CRM

12. Fiscal

OBJETIVO

Centralizar e automatizar cálculos tributários. Reduzir erros e divergências entre pedido e nota fiscal.


QUANDO IMPLANTAR

No início da implantação dos processos fiscais, antes de Vendas, Compras e Faturamento.

PRÉ-REQUISITO

Informações fiscais alinhadas com o cliente e contador (regime tributário, regras, NCM, CFOP, CST/CSOSN).

FLUXO OPERACIONAL



IMPORTANTE

O consultor **NÃO define regras tributárias**. A configuração deve ser validada pelo responsável fiscal.

CHECKLIST DE VALIDAÇÃO

- [ ] Cadastrar e consultar informações fiscais
- [ ] Compreender regras tributárias
- [ ] Identificar cálculo de impostos na venda
- [ ] Emitir notas com configurações cadastradas
- [ ] Realizar compras com cálculo de impostos de entrada
- [ ] Conferir divergências fiscais no recebimento

13. Relatórios e Análises REVER

OBJETIVO

Transformar dados em informações estratégicas. Criar relatórios personalizados, tabelas dinâmicas e acompanhar indicadores.

QUANDO IMPLANTAR

Após os principais módulos operacionais, com dados já cadastrados e movimentações realizadas.

CHECKLIST DE VALIDAÇÃO

- [ ] Criar relatório com informações do sistema
- [ ] Aplicar filtros, agrupamentos e totais
- [ ] Usar tabelas dinâmicas
- [ ] Consultar informações de diferentes módulos
- [ ] Exportar em Excel, PDF ou CSV
- [ ] Compartilhar relatórios

14. Tarefas

OBJETIVO

Organizar e acompanhar atividades das equipes. Controlar responsabilidades, prazos e andamento através de quadros visuais.

QUANDO IMPLANTAR

Após os processos que utilizarão o gerenciamento de atividades (Projetos e Obras, CRM, etc.).

FLUXO OPERACIONAL

Fluxo Tarefas

Criação da Tarefa →
Definição do Responsável e Prazo →
Execução da Atividade →
Acompanhamento → Conclusão

CHECKLIST DE VALIDAÇÃO

- [ ] Criar quadros e organizar tarefas por etapas
- [ ] Criar cartões com responsáveis, prazos e prioridades
- [ ] Usar checklists e comentários
- [ ] Acompanhar atividades pendentes e atrasadas
- [ ] Consultar tarefas por usuário ou equipe
- [ ] Usar modelos para processos repetitivos

15. Alumina (IA) REVER

OBJETIVO

Assistente inteligente dentro do Faktory Flow. Consultar informações, realizar análises e executar ações por comandos em linguagem natural (texto ou voz).

QUANDO IMPLANTAR

Após os principais módulos operacionais, com dados suficientes para consultas.

FLUXO OPERACIONAL

Fluxo Alumina (IA)

Pergunta do Usuário →
Consulta das Informações →
Análise dos Dados →
Sugestão de Ação →
Confirmação →
Execução Registrada

CHECKLIST DE VALIDAÇÃO

- [ ] Realizar perguntas por texto ou voz
- [ ] Consultar informações dos módulos
- [ ] Interpretar respostas e gráficos
- [ ] Solicitar sugestões de ações
- [ ] Compreender processo de confirmação
- [ ] Entender permissões e segurança

ANOTAÇÕES

PARTE VI

Implantação Completa — Estudo de Caso

Seção em desenvolvimento. Será preenchida com um caso prático completo de implantação, ilustrando a aplicação de todos os conceitos apresentados neste guia.

EM ELABORAÇÃO

Esta seção está reservada para um estudo de caso detalhado. O conteúdo será incluído em versões futuras desta apostila.

PARTE VII

Biblioteca de Processos e Diagnóstico

Desenvolver a visão consultiva do implantador. Compreender os processos de negócio dos clientes, identificar causas de problemas e entender a integração entre os módulos.

Objetivo da seção

Esta etapa tem como objetivo capacitar o consultor a analisar situações, investigar antes de registrar chamados e orientar o cliente de forma segura e eficiente.

Biblioteca de Processos


Apresenta o funcionamento esperado dos principais fluxos da empresa dentro do sistema.

Biblioteca de Problemas

Apresenta uma metodologia de análise para identificar se uma situação é causada por configuração, operação incorreta ou falha do sistema.

Processo Comercial (CRM e Vendas)

O processo comercial representa o início da jornada do cliente dentro do Faktory Flow. Ele acompanha desde o primeiro contato até a transformação da oportunidade em uma venda efetivada.

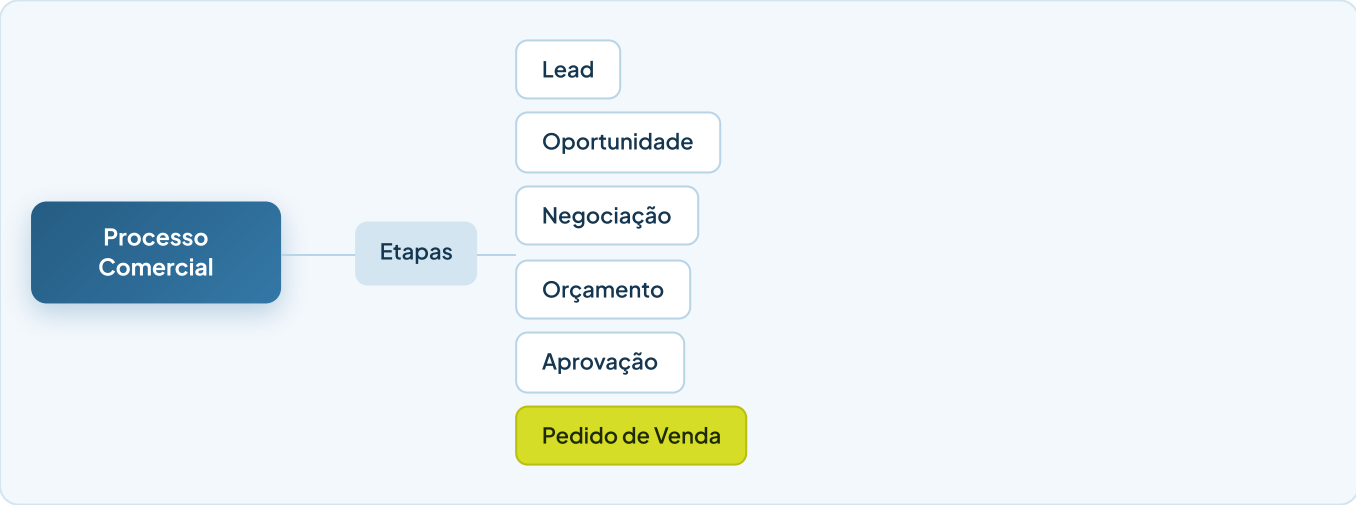

O que validar na implantação


- Como a empresa recebe novos clientes
- Quem realiza os atendimentos
- Como são feitos os orçamentos
- Quais informações são obrigatórias para aprovação
- Quando um orçamento se transforma em pedido

PONTOS DE ATENÇÃO

Evitar criar pedidos antes da aprovação comercial. Garantir que produtos, valores e condições estejam corretamente cadastrados. Validar se as informações da venda serão utilizadas pelos próximos setores.

Processo de Compras

Garantir que a empresa tenha os materiais necessários para sua operação, mantendo controle sobre solicitações, fornecedores, pedidos e recebimentos.




Processo de Produção

Transformar o pedido aprovado em produto fabricado, garantindo controle das etapas de fabricação e acompanhamento da execução. Em empresas de esquadrias, esse processo envolve perfis, vidros, componentes, corte, montagem e conferência.




Processo Financeiro

Controlar todas as movimentações relacionadas a pagamentos, recebimentos e acompanhamento do resultado da empresa.

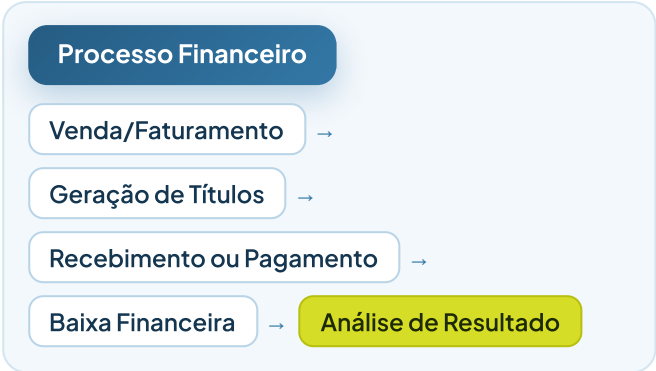

Processo Fiscal

Garantir que as operações realizadas pela empresa estejam corretamente configuradas para cálculo de impostos e emissão dos documentos fiscais. O módulo Fiscal depende principalmente das informações cadastradas pela empresa e pelo contador.




IMPORTANTE

O consultor não define regras tributárias. A configuração deve ser validada pelo responsável fiscal. Erros fiscais geralmente possuem relação com cadastro ou parametrização.


Processo de Expedição

Controlar o processo de entrega dos produtos ao cliente após a finalização da venda e faturamento.

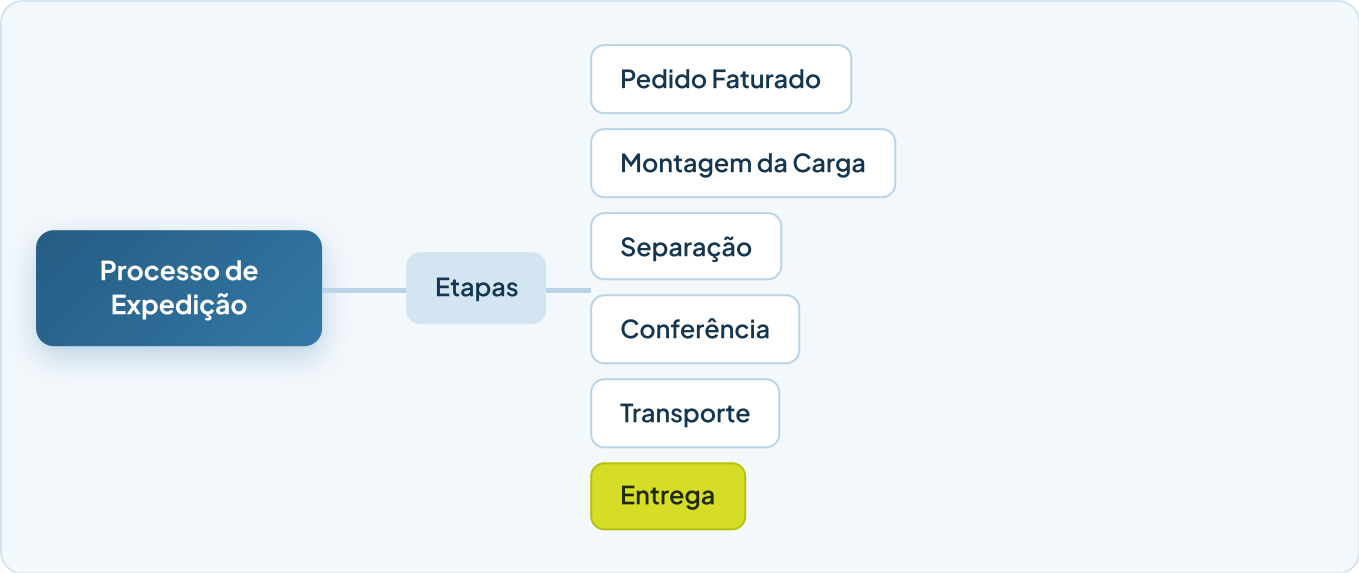

Processo de Projetos e Obras

Organizar a execução de obras, permitindo acompanhar materiais, custos, produção, serviços e resultado financeiro. A obra passa a ser tratada como um centro de acompanhamento, permitindo identificar se o projeto está dentro do planejado.

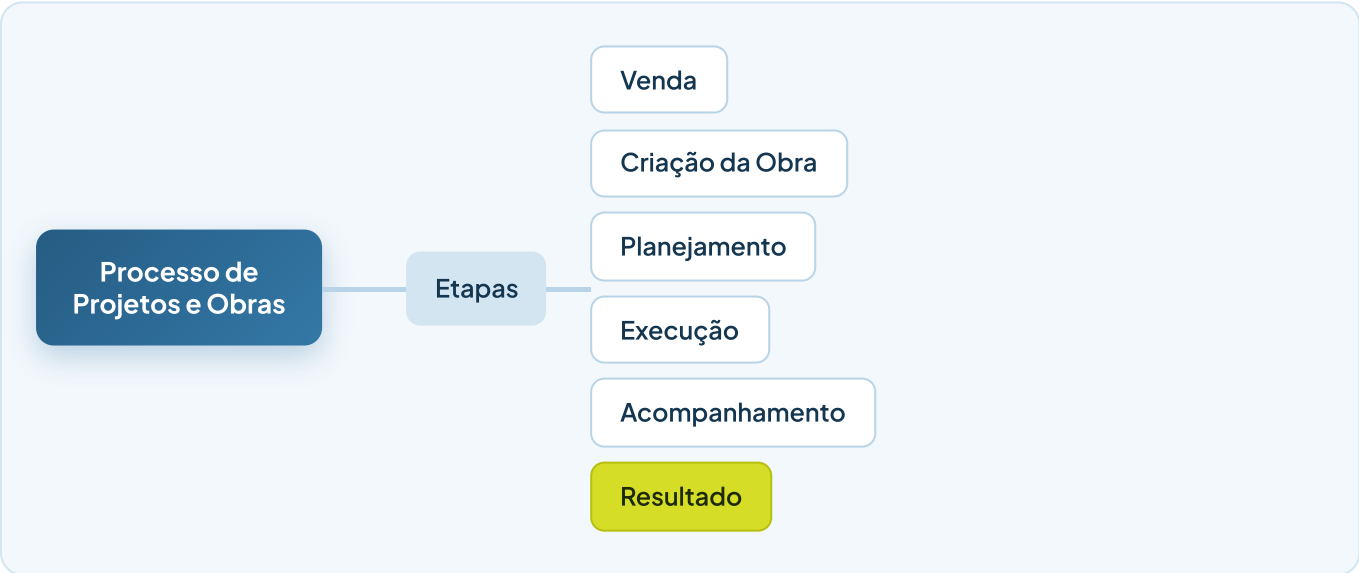

PONTOS DE ATENÇÃO

Vincular corretamente vendas e obras. Registrar custos reais. Utilizar diário de obra para histórico.


ANOTAÇÕES

Biblioteca de Problemas — Diagnóstico

Durante uma implantação ou operação, o consultor receberá diferentes situações relatadas pelos clientes. Antes de encaminhar um chamado, é necessário realizar uma análise inicial para identificar:

- Se é configuração
- Se é falta de conhecimento do processo
- Se é erro operacional
- Se realmente é um problema do sistema

Metodologia de Análise do Consultor

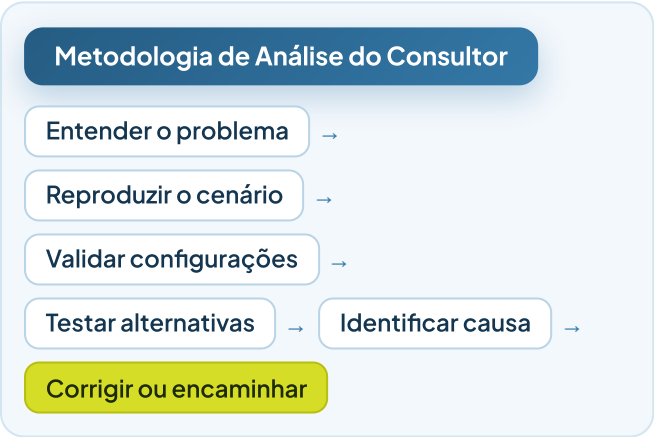

Exemplo: Cliente não consegue emitir Nota Fiscal

1. O que perguntar (entender o cenário)

- Qual nota está tentando emitir?
- Qual mensagem de erro aparece?
- Acontece com todos os pedidos ou apenas um?
- Já conseguiu emitir anteriormente?
- O problema acontece em homologação ou produção?

2. Onde olhar (verificar configurações)

ÁREA	O QUE VERIFICAR
Produto	Possui NCM? Possui tributação? Está corretamente configurado?
Cliente	CNPJ correto? Inscrição estadual? Endereço?
Fiscal	CFOP? CST/CSOSN? Série da nota? Certificado digital?

3. Como validar (realizar testes)

- Conferir cadastro do produto
- Conferir dados fiscais
- Criar nova operação
- Tentar emitir novamente
- Comparar com outro produto ou cliente

LEMBRE-SE

Sempre seguir: entender o problema → reproduzir o cenário → validar configurações → testar alternativas → identificar causa → corrigir ou encaminhar.

CONCLUSÃO

Encerramento do Guia

Os pilares de uma implantação estruturada e o papel transformador do consultor.

Os quatro pilares

Conhecimento dos Módulos

Entender como cada área se conecta, do primeiro contato comercial à entrega e análise de resultados.

Compreensão dos Processos

Implantar respeitando a realidade operacional do cliente, evitando replicar telas sem gerar valor.

Análise de Problemas

Identificar a causa antes de encaminhar. Postura consultiva e eficiente, diferenciando configuração, operação e bug.

Comunicação Organizada

Registrar decisões, acompanhar pendências, formalizar entregas e manter o cliente alinhado durante todo o projeto.

O papel do consultor

A implantação de um sistema não consiste apenas em apresentar funcionalidades ou ensinar o uso das telas. O papel do consultor é compreender a operação do cliente, traduzir seus processos para dentro do sistema e garantir que a ferramenta seja utilizada de forma correta e eficiente.

O consultor de implantação deve ser visto como o **elo entre o cliente e a tecnologia**. Seu objetivo não é apenas colocar o sistema para funcionar, mas **conduzir uma transformação na forma como a empresa trabalha**, garantindo organização, controle e evolução dos processos através do Faktory Flow.

LEMBRE-SE SEMPRE

O sucesso de uma implantação não é medido pela quantidade de reuniões realizadas, mas pela **capacidade do cliente de utilizar o Faktory Flow com autonomia, segurança e confiança em seus processos**.

— ANOTAÇÕES FINAIS

Fim da Apostila

Este material é de uso interno e foi desenvolvido para capacitar consultores de implantação do Faktory Flow. Em caso de dúvidas ou sugestões de melhoria, entre em contato com a equipe responsável.

Apostila do Consultor
Versão 1.0 · 2025
Material de uso interno
