# Apostila do Consultor de Implantação

Guia completo para conduzir implantações do Faktory Flow com método, clareza e autonomia.

**Versão** 1.0 · Material de uso interno

**Público-alvo** Consultores de implantação, novos colaboradores e estagiários

**Última atualização** 2025

FICHA TÉCNICA

# Sobre esta Apostila

Informações gerais sobre o material, seu propósito e como utilizá-lo durante a implantação.

## PROPÓSITO

Esta apostila tem como objetivo capacitar consultores de implantação a compreender os processos de negócio dos clientes, conduzir treinamentos com autonomia, orientar usuários, identificar riscos e diagnosticar problemas antes de encaminhar chamados. O foco é o **processo de negócio**, não apenas a funcionalidade do sistema.

## A QUEM SE DESTINA

- Consultores de implantação do Faktory Flow
- Novos colaboradores em treinamento
- Estagiários e profissionais em formação
- Usuários de empresas clientes que precisam compreender o fluxo de implantação

## COMO USAR

- Leia a Parte I e Parte II antes de iniciar qualquer implantação
- Consulte os módulos da Parte V conforme o escopo contratado
- Use a Biblioteca de Processos (Parte VII) como referência durante o dia a dia
- Utilize as seções de anotações ao final de cada parte para registrar observações pessoais

## ESTRUTURA DO MATERIAL

- **Parte I** — A Implantação: conceitos, papel do consultor e responsabilidades
- **Parte II** — O Método Faktory: as 7 etapas padronizadas
- **Parte V** — Os Módulos: descrição funcional de cada módulo
- **Parte VI** — Estudo de Caso: implantação completa (em elaboração)
- **Parte VII** — Biblioteca de Processos e Diagnóstico de Problemas

## CONTROLE DE VERSÃO

**Versão 1.0** — 2025 · Versão inicial otimizada, com fluxos impressos e checklists revisados.

SUMÁRIO

# Índice de Conteúdo


I A Implantação 5

1 O que é implantar o Faktory Flow 5

2 O papel do consultor 5

3 Conhecendo o cliente e suas responsabilidades 6

4 Como conduzir o projeto 7

II O Método Faktory 9

1 Reunião de Alinhamento (RA) 9

2 Configuração do ambiente 9

3 Definição do cronograma 10

4 Treinamentos 10

5 Preparação para o Go-live 11

6 Go-live 11

7 Encerramento da implantação 11

V Os Módulos do Faktory Flow 13

1 Vendas 14

2 Faturamento 15

3 Financeiro 17

4 CRM 18

5 Produção 19

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Compras | 20 |
| 7 | Recebimento | 21 |
| 8 | Estoque | 22 |
| 9 | Expedição | 23 |
| 10 | Serviços e Instalação | 24 |
| 11 | Projetos e Obras | 25 |
| 12 | Fiscal | 26 |
| 13 | Relatórios e Análises | 27 |
| 14 | Tarefas | 28 |
| 15 | Alumina (IA) | 29 |
| VI | Estudo de Caso | 31 |
| VII | Biblioteca de Processos e Diagnóstico | 32 |
| 1 | Biblioteca de Processos | 32 |
| 2 | Biblioteca de Problemas — Diagnóstico | 36 |
| — | Conclusão do Guia | 39 |

PARTE I

# A Implantação

O que é implantar, o papel do consultor, as responsabilidades do cliente e como conduzir o projeto.

## 1. O que é implantar o Faktory Flow

O Faktory Flow centraliza e integra os processos da empresa em um único ambiente. A implantação **não é apenas instalar o sistema** — é preparar a empresa para usá-lo com autonomia.

| ETAPA | O QUE ACONTECE |
|---|---|
| Reunião de Alinhamento | Conhecer o cliente e definir o projeto |
| Configuração do ambiente | Garantir acessos e pré-requisitos técnicos |
| Cronograma | Organizar datas, módulos e participantes |
| Treinamentos | Ensinar processos, não apenas telas |
| Preparação para o Go-live | Validar cadastros, acessos e fluxos |
| Go-live | Entrada em produção assistida |
| Encerramento | Formalizar a conclusão e migrar para o Suporte |

**REGRA DE OURO**

Cada etapa depende da conclusão da anterior. Não antecipe atividades sem os pré-requisitos prontos.

## 2. O papel do consultor

Você é um **facilitador**, não um instrutor de telas. Seu trabalho é traduzir a realidade do cliente para dentro do sistema.

### O que você FAZ

- Compreende os processos do cliente antes de treinar
- Organiza etapas e registra decisões
- Identifica riscos e pendências com responsáveis e prazos
- Desenvolve a autonomia dos usuários
- Diferencia erro de parametrização, falha operacional e bug

### O que você NÃO FAZ

- Não promete funcionalidades que não existem
- Não decide regras internas, fiscais ou contábeis pelo cliente
- Não assume responsabilidades que pertencem à gestão da empresa

> **ATENÇÃO**
> Questões fiscais (NCM, CFOP, CST, tributação) devem ser validadas **pelo cliente e seu contador**. Você orienta, não decide.

## 3. Conhecendo o cliente e suas responsabilidades

A **Reunião de Alinhamento (RA)** é o momento para entender o cenário.

### O que levantar na RA

- Atividade principal da empresa
- Processo comercial
- Módulos contratados
- Integrações (CEM Desktop, Mobi)
- Como emitem Nota Fiscal hoje
- Como controlam o financeiro
- Responsáveis pelo projeto

### Papéis do cliente

| PAPEL | RESPONSABILIDADE |
|---|---|
| **Sponsor** | Apoio e decisões estratégicas |
| **Gerente de Projetos** | Acompanha cronograma, centraliza decisões, administra horas |
| **Key User** | Conhece os processos, participa das validações, é referência para os demais |

— ANOTAÇÕES

## 4. Como conduzir o projeto

A condução segue uma ordem lógica. Cada etapa prepara a próxima.

### Ordem lógica da condução



## Princípios de condução

- Ensine **processos**, não funcionalidades
- Mostre o **impacto** de cada ação nos módulos seguintes
- Use exemplos da rotina do cliente
- Uma etapa só termina quando o cliente **compreende, executa e valida**

**EXEMPLO PRÁTICO**

Um pedido de venda gera nota fiscal e títulos no Contas a Receber. Por isso, Vendas, Faturamento, Fiscal e Financeiro devem ser treinados de forma conectada.

## Preparação para as próximas etapas

Antes de ensinar o sistema, o consultor precisa compreender o projeto que está conduzindo. O Faktory Flow é a ferramenta utilizada para organizar os processos da empresa, mas é a atuação do consultor, em conjunto com o envolvimento do cliente, que transforma essa ferramenta em uma solução realmente aplicada à rotina do negócio.

ANOTAÇÕES


PARTE II

# O Método Faktory

Sequência padronizada de implantação. Cada etapa possui objetivo específico e depende da conclusão da etapa anterior.

**SEQUÊNCIA OBRIGATÓRIA**

O consultor deve respeitar a ordem da implantação e evitar antecipar atividades que ainda não possuem os pré-requisitos necessários.

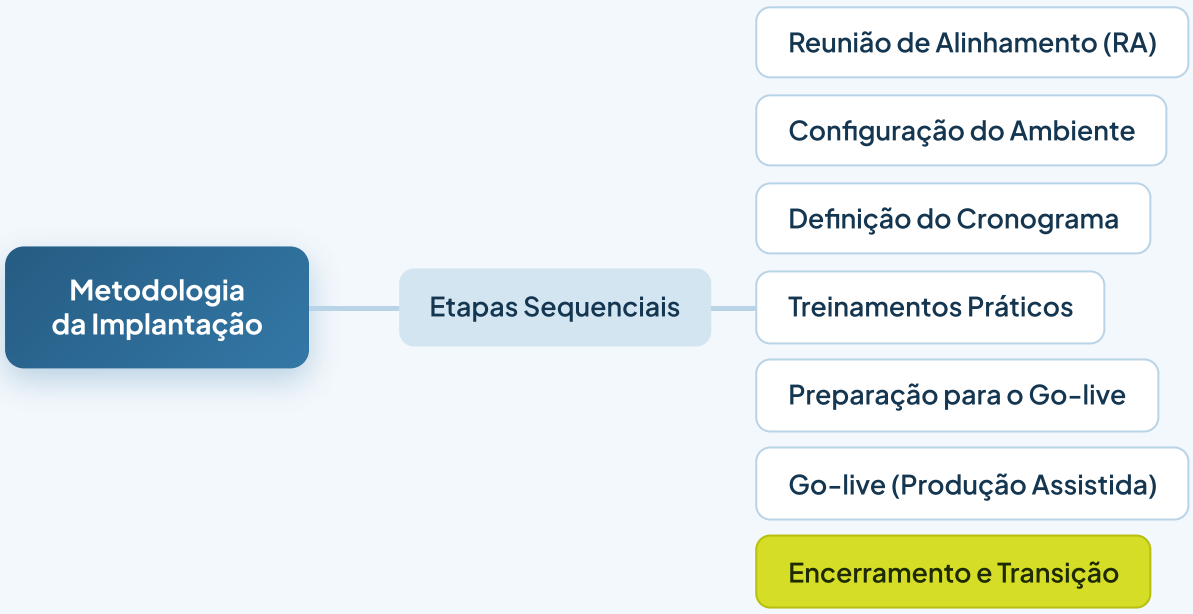


## 1. Reunião de Alinhamento (RA)

Início oficial do projeto. Seu principal objetivo é conhecer o cliente, apresentar a metodologia da Faktory, alinhar expectativas e definir como a implantação será conduzida.

**O que apresentar:** escopo contratado, etapas do projeto, papel de cada participante, atendimentos, registros em Ordem de Serviço, reagendamentos e transição para o Suporte.

## 2. Configuração do ambiente

Garantir que toda a estrutura necessária para os treinamentos esteja pronta.


- [ ] Acesso ao Faktory Flow
- [ ] Usuários cadastrados e permissões corretas
- [ ] Internet estável
- [ ] Ferramenta de acesso remoto instalada
- [ ] Agent Faktory configurado (se utilizar CEM Desktop)

> **ATENÇÃO**
> Se algum pré-requisito não estiver pronto, resolva **antes** de iniciar os treinamentos.

## 3. Definição do cronograma

Organizar a implantação — quais módulos, em qual ordem, com quais usuários e quais objetivos.

### Sequência lógica recomendada

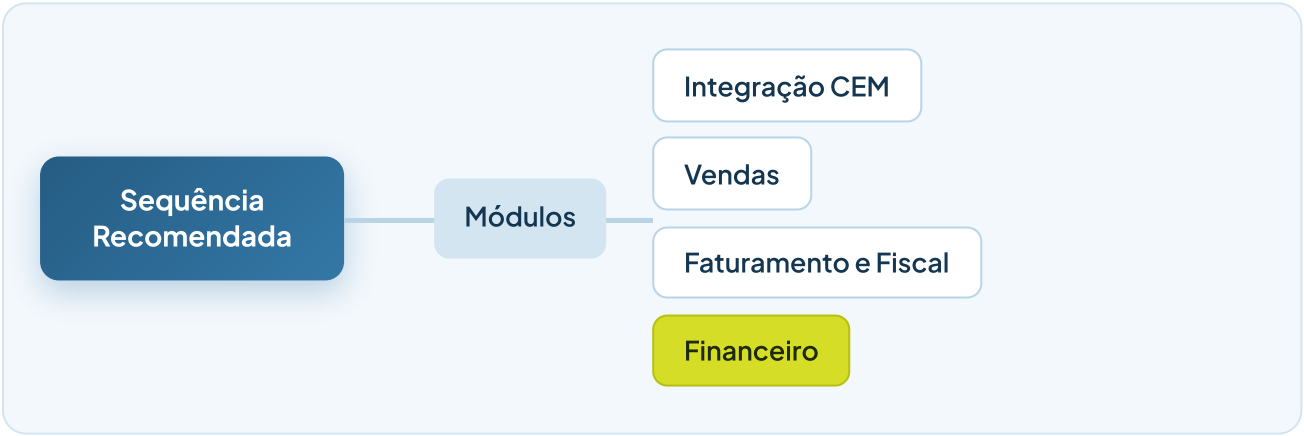


## 4. Treinamentos

Etapa de maior interação entre consultor e cliente. Mais do que apresentar funcionalidades, o consultor deve **ensinar processos**. O cliente precisa compreender:

- Quando utilizar determinada função
- Por que utilizá-la
- Quais informações são obrigatórias
- Quais impactos aquela ação gera nos demais módulos

## 5. Preparação para o Go-live

Antes da entrada em produção, é necessário validar que a empresa está preparada para utilizar o sistema em sua operação diária.

- [ ] Principais cadastros realizados
- [ ] Usuários com acesso ao sistema
- [ ] Processos testados
- [ ] Configurações fiscais revisadas
- [ ] Fluxos financeiros validados
- [ ] Integrações previstas funcionando

O objetivo não é eliminar todas as dúvidas, mas garantir que o cliente possua segurança para iniciar a utilização do sistema.

## 6. Go-live

Momento em que a empresa passa a utilizar o Faktory Flow como seu sistema oficial. Normalmente, os primeiros dias geram dúvidas, ajustes e validações adicionais. Por isso, a metodologia prevê uma **entrada em produção assistida**.

## 7. Encerramento da implantação

A implantação é considerada concluída quando os objetivos definidos foram alcançados e o cliente está apto a utilizar o sistema em sua rotina.

### Antes de finalizar o projeto

- [ ] Revisar todas as pendências
- [ ] Confirmar que os treinamentos previstos foram realizados
- [ ] Garantir que as Ordens de Serviço estejam aprovadas
- [ ] Formalizar a conclusão junto ao cliente

**IMPORTANTE**

Após o encerramento, dúvidas operacionais passam para o **Suporte**. Novos acompanhamentos consultivos exigem nova carga de horas.

**MÉTRICA DE SUCESSO**

O sucesso não é medido pela quantidade de reuniões realizadas, mas pela **capacidade do cliente de usar o Faktory Flow com autonomia, segurança e confiança**.

**ANOTAÇÕES**

PARTE V

# Os Módulos do Faktory Flow

Embora cada módulo possua características específicas, todos fazem parte de um único fluxo operacional. Os treinamentos devem ser conduzidos de forma integrada.

**ORDEM DE IMPLANTAÇÃO**

Os primeiros módulos a serem implantados são **Vendas** → **Faturamento** → **Fiscal** → **Financeiro**. Os demais seguem conforme o escopo contratado e a necessidade de cada cliente.

## Estrutura de cada módulo neste guia

| SEÇÃO | O QUE CONTÉM |
|---|---|
| Objetivo do módulo | Finalidade e importância dentro do Faktory Flow |
| Papel na operação | Como o módulo se integra aos demais processos |
| Quando implantar | Fase do projeto em que o treinamento deve ocorrer |
| Fluxo operacional | Sequência recomendada de utilização |
| Condução do treinamento | Orientações para apresentar o processo |
| Boas práticas | Recomendações para reduzir retrabalhos |
| Checklist de validação | Pontos a confirmar antes de considerar implantado |

Os módulos a seguir são apresentados em blocos padronizados. Consulte cada um conforme o escopo contratado.

# 1. Vendas

### OBJETIVO

Gerenciar o processo comercial, da criação do pedido ao faturamento. Integrado ao CEM, importa orçamentos sem redigitação.

### PAPEL NA OPERAÇÃO

Inicia o fluxo operacional. Alimenta Faturamento, Fiscal, Financeiro, Produção e Expedição.

### QUANDO IMPLANTAR

Após configuração dos cadastros básicos e, preferencialmente, com integração CEM configurada.

### FLUXO OPERACIONAL




### CONDUÇÃO DO TREINAMENTO

Priorize exemplos reais da empresa. O fluxo pode ser adaptado (ex: usar status "Encerrado" e gerar títulos antes do "Faturado"). O importante é que os usuários compreendam a lógica do processo.

### BOAS PRÁTICAS

- Validar dados importados antes da aprovação
- Explicar a importância dos status do pedido
- Demonstrar faturamento parcial quando aplicável
- Relacionar sempre aos demais módulos

### CHECKLIST DE VALIDAÇÃO

- [ ] Importar orçamento do CEM (quando aplicável)
- [ ] Cadastrar e aprovar pedido de venda
- [ ] Realizar faturamento
- [ ] Compreender integração com Faturamento, Financeiro, Serviços, Produção e Expedição

## 2. Faturamento

### OBJETIVO

Emitir documentos fiscais (NF-e/NFS-e), transmitir aos órgãos fiscais e integrar com Financeiro, Estoque e Expedição.


### PAPEL NA OPERAÇÃO

Conecta a área comercial às etapas fiscais e operacionais.

### QUANDO IMPLANTAR

Após o módulo de Vendas e configuração das regras fiscais (CFOP, NCM, impostos, certificado digital).

## FLUXO OPERACIONAL

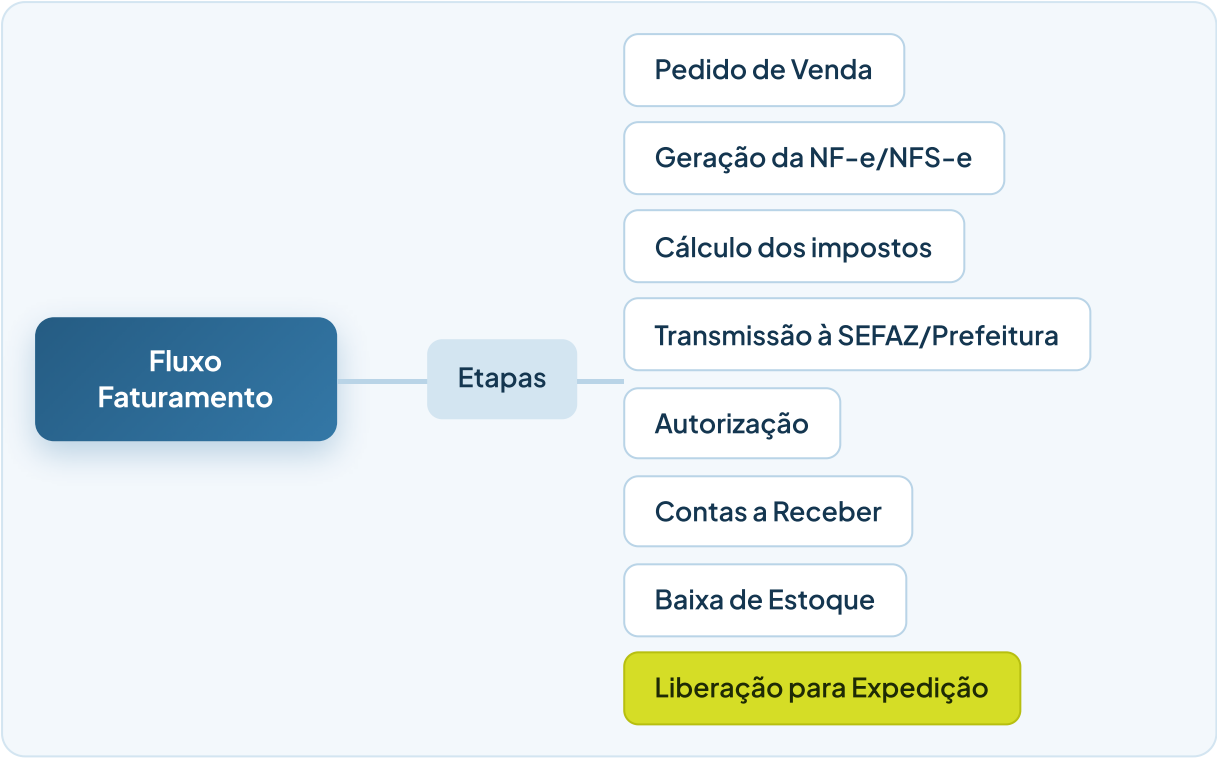


## BOAS PRÁTICAS

- Validar configurações fiscais antes dos testes
- Conferir certificado digital e validade
- Orientar sobre impactos da autorização e cancelamento
- Demonstrar integração com Financeiro, Estoque e Expedição

## CHECKLIST DE VALIDAÇÃO

- [ ] Gerar NF-e ou NFS-e a partir de um pedido
- [ ] Transmitir e acompanhar retorno da autorização
- [ ] Emitir DANFE e XML
- [ ] Realizar carta de correção e cancelamento (quando aplicável)
- [ ] Compreender impactos nos módulos Financeiro, Estoque e Expedição

# 3. Financeiro

### OBJETIVO

Gerenciar movimentações financeiras — contas a receber, contas a pagar, cobranças, pagamentos, conciliação bancária e fluxo de caixa.

### PAPEL NA OPERAÇÃO

Recebe informações de Vendas, Faturamento, Compras e Recebimento. Elimina lançamentos manuais.

### QUANDO IMPLANTAR

Após Vendas, Faturamento e configurações financeiras (plano de contas, contas bancárias, meios e condições de pagamento).

### FLUXO OPERACIONAL




### BOAS PRÁTICAS

- Configurar contas bancárias, plano de contas e meios de pagamento antes de operar
- Incentivar geração automática de títulos
- Demonstrar importância da conciliação e fluxo de caixa
- Orientar uso dos demonstrativos para decisões

**CHECKLIST DE VALIDAÇÃO**

- [ ] Consultar contas a receber e a pagar
- [ ] Realizar recebimentos e pagamentos
- [ ] Consultar fluxo de caixa e demonstrativos
- [ ] Compreender integração com Vendas, Faturamento, Compras e Recebimento

## 4. CRM

**OBJETIVO**

Gerenciar o relacionamento com clientes, do primeiro contato ao pós-venda.


**PAPEL NA OPERAÇÃO**

Porta de entrada do processo comercial. Oportunidades são convertidas em pedidos de venda.

**QUANDO IMPLANTAR**

Antes do módulo de Vendas.

### FLUXO OPERACIONAL

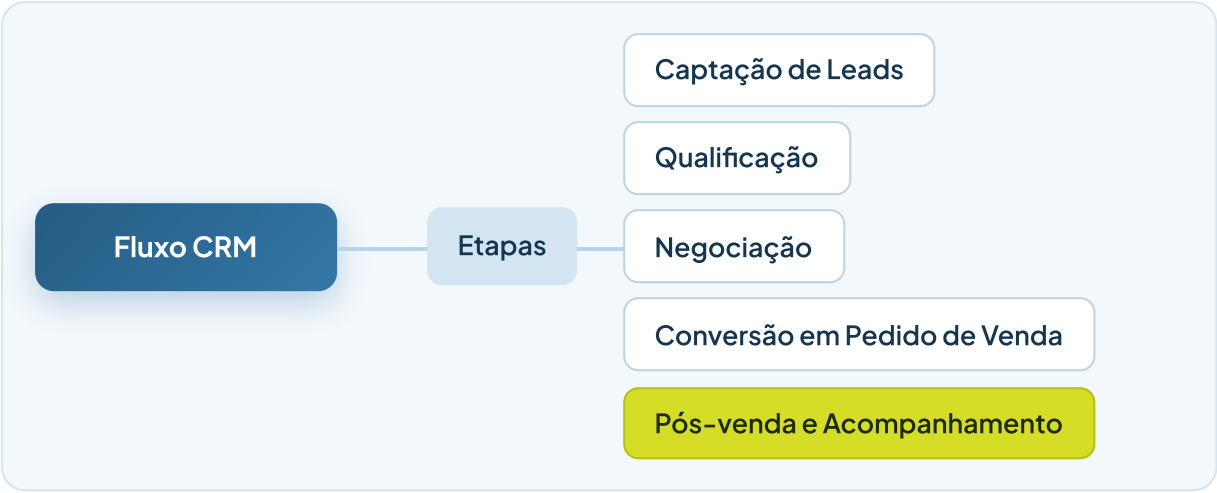


### CHECKLIST DE VALIDAÇÃO

- [ ] Cadastrar contato ou oportunidade
- [ ] Movimentar oportunidades no funil
- [ ] Registrar atividades e acompanhamentos
- [ ] Converter oportunidade em pedido de venda
- [ ] Consultar histórico e visão do cliente

## 5. Produção


### OBJETIVO

Transformar pedidos de venda em ordens de produção, organizando planejamento, consumo de materiais e etapas produtivas.

### QUANDO IMPLANTAR

Após Vendas e Estoque.

### FLUXO OPERACIONAL

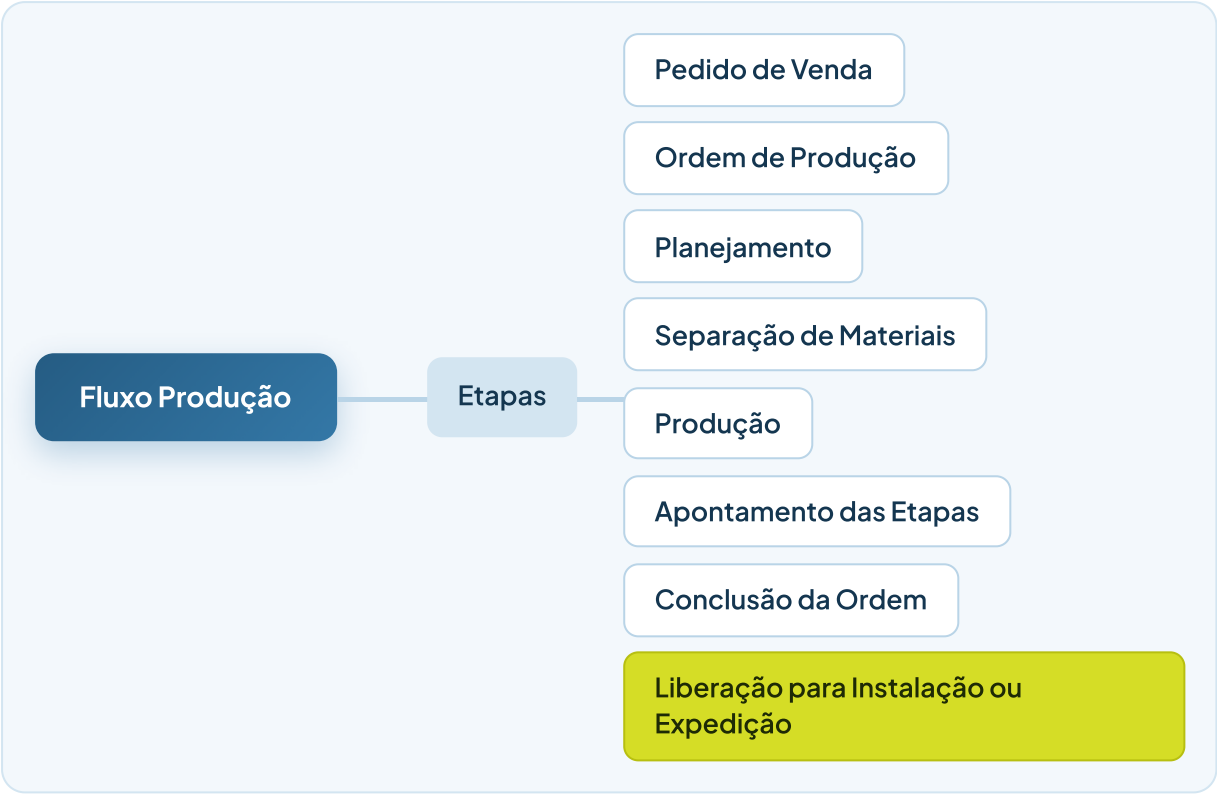


### CHECKLIST DE VALIDAÇÃO

- [ ] Gerar ordem de produção a partir de pedido
- [ ] Planejar e acompanhar produção
- [ ] Realizar apontamentos das etapas
- [ ] Consultar andamento das ordens
- [ ] Compreender integração com Vendas, Estoque, Compras e Expedição

## 6. Compras

### OBJETIVO

Gerenciar aquisição de materiais — cotações, comparação de fornecedores, pedidos e acompanhamento de entregas.

### QUANDO IMPLANTAR

Após Estoque e Produção.

### FLUXO OPERACIONAL




### CHECKLIST DE VALIDAÇÃO

- [ ] Gerar solicitação de compra
- [ ] Realizar cotação com fornecedores
- [ ] Emitir pedido de compra
- [ ] Acompanhar entrega dos materiais
- [ ] Compreender integração com Produção, Recebimento, Financeiro e Estoque

## 7. Recebimento

### OBJETIVO

Controlar entrada de mercadorias — importação da NF do fornecedor, conferência e integração com Estoque, Compras, Financeiro e Fiscal.

### QUANDO IMPLANTAR

Após Compras.

**CHECKLIST DE VALIDAÇÃO**

- [ ] Importar NF de fornecedor
- [ ] Conferir itens recebidos
- [ ] Registrar divergências ou avarias
- [ ] Finalizar recebimento
- [ ] Compreender integração com Compras, Estoque, Financeiro e Fiscal

## 8. Estoque


**OBJETIVO**

Controlar movimentação de materiais. No Faktory Flow, o estoque é controlado por características (cor, largura, altura, comprimento), ideal para esquadrias.

**QUANDO IMPLANTAR**

Após configuração dos cadastros de produtos e antes de Compras, Produção e Recebimento.

### FLUXO OPERACIONAL

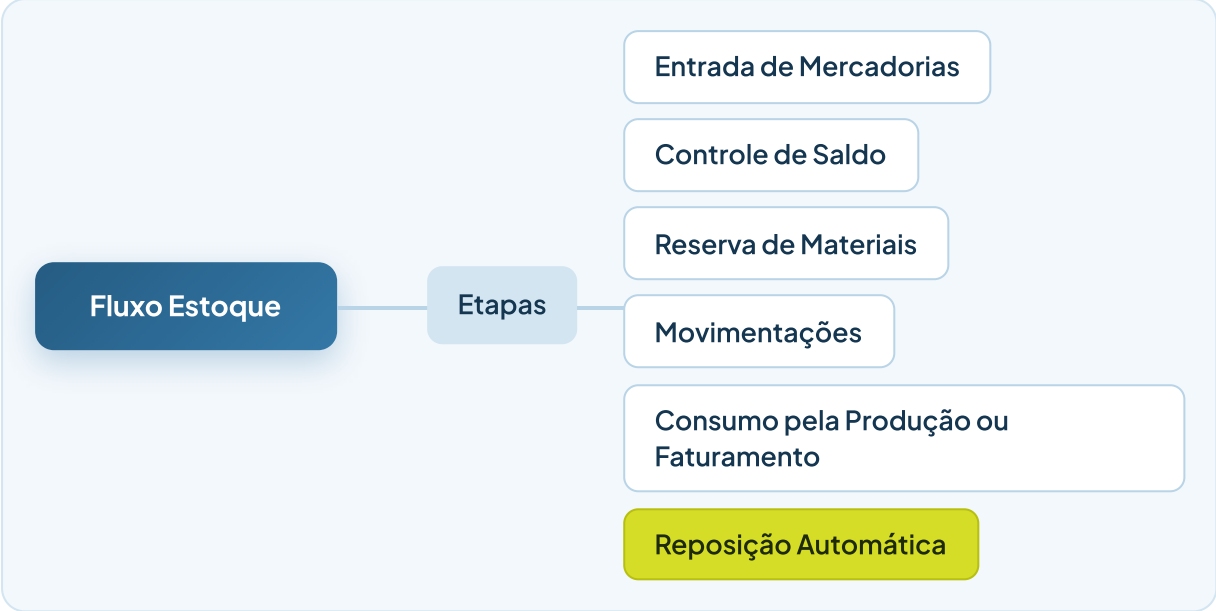


### CHECKLIST DE VALIDAÇÃO

- [ ] Consultar saldos dos produtos
- [ ] Realizar movimentações e transferências
- [ ] Entender reservas de materiais
- [ ] Executar inventários e ajustes
- [ ] Compreender integração com Compras, Recebimento, Produção, Vendas e Faturamento

## 9. Expedição

### OBJETIVO

Organizar a entrega dos produtos — montagem da carga, conferência, carregamento e transporte.

### QUANDO IMPLANTAR

Após Vendas, Faturamento, Produção e Estoque.

**CHECKLIST DE VALIDAÇÃO**

- [ ] Montar carga com pedidos faturados
- [ ] Realizar conferência e carregamento
- [ ] Acompanhar status das entregas
- [ ] Registrar confirmação de recebimento
- [ ] Compreender integração com Vendas, Estoque, Produção e Faturamento

## 10. Serviços e Instalação REVER


**OBJETIVO**

Controlar atividades fora da fábrica — medição em obra, instalação, vistoria e assistência técnica.

**QUANDO IMPLANTAR**

Após Vendas, Produção e Expedição.

### FLUXO OPERACIONAL

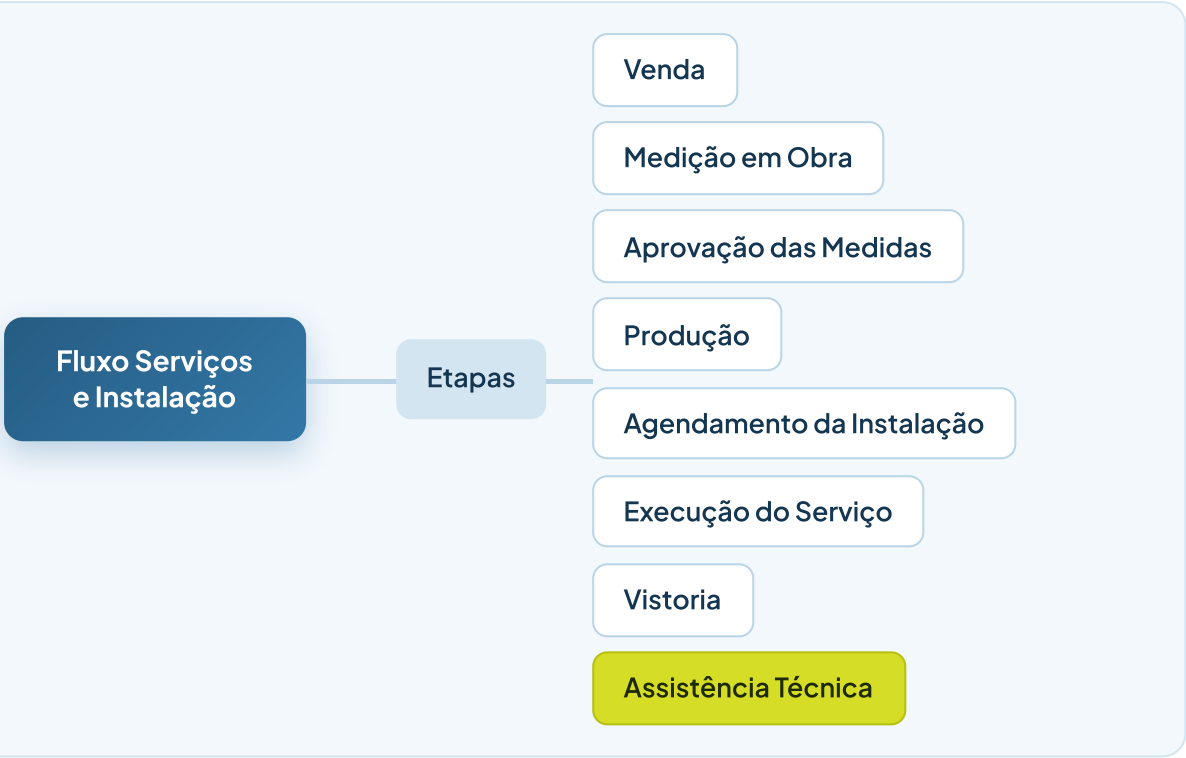


### CHECKLIST DE VALIDAÇÃO

- [ ] Realizar medição em obra e registrar informações
- [ ] Comparar medidas com o pedido vendido
- [ ] Organizar agenda das equipes
- [ ] Registrar checklist, fotos e aceite
- [ ] Realizar vistoria e abertura de assistência técnica
- [ ] Consultar histórico
- [ ] Compreender integração com Vendas, Produção, Expedição, Faturamento e Projetos

## 11. Projetos e Obras REVER

### OBJETIVO

Centralizar informações das obras — do planejamento à conclusão. Transforma cada obra em centro de controle e resultado.

**QUANDO IMPLANTAR**

Após Vendas, Compras, Produção, Estoque e Financeiro.

**CHECKLIST DE VALIDAÇÃO**

- [ ] Criar e configurar nova obra
- [ ] Organizar fases e etapas
- [ ] Planejar necessidades de materiais
- [ ] Acompanhar compras, produção, estoque e serviços
- [ ] Consultar receitas, custos e margem
- [ ] Usar diário de obra
- [ ] Identificar diferenças entre previsto e realizado
- [ ] Compreender integração com Vendas, Compras, Produção, Estoque, Financeiro, Serviços e CRM

## 12. Fiscal

**OBJETIVO**

Centralizar e automatizar cálculos tributários. Reduzir erros e divergências entre pedido e nota fiscal.


**QUANDO IMPLANTAR**

No início da implantação dos processos fiscais, antes de Vendas, Compras e Faturamento.

**PRÉ-REQUISITO**

Informações fiscais alinhadas com o cliente e contador (regime tributário, regras, NCM, CFOP, CST/CSOSN).

### FLUXO OPERACIONAL

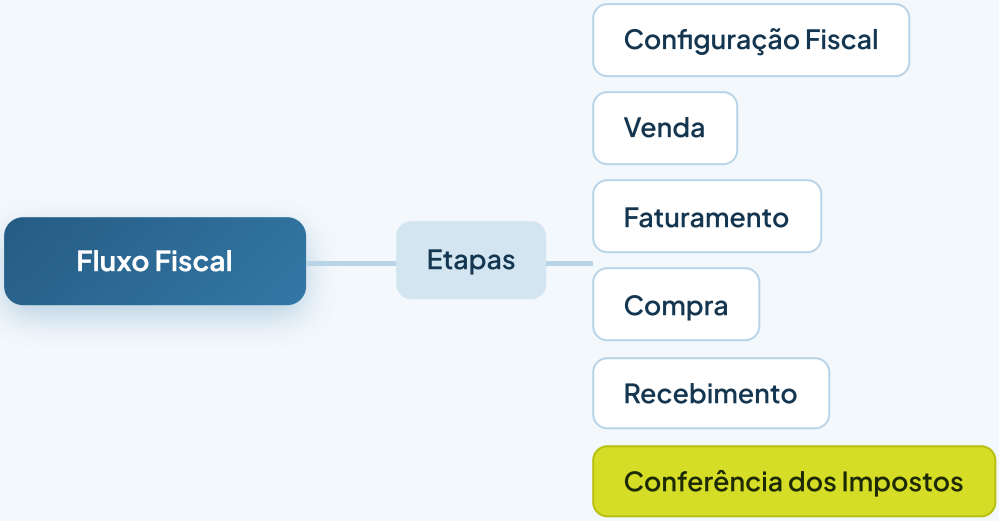


**IMPORTANTE**

O consultor **NÃO define regras tributárias**. A configuração deve ser validada pelo responsável fiscal.

### CHECKLIST DE VALIDAÇÃO

- [ ] Cadastrar e consultar informações fiscais
- [ ] Compreender regras tributárias
- [ ] Identificar cálculo de impostos na venda
- [ ] Emitir notas com configurações cadastradas
- [ ] Realizar compras com cálculo de impostos de entrada
- [ ] Conferir divergências fiscais no recebimento

## 13. Relatórios e Análises REVER

### OBJETIVO

Transformar dados em informações estratégicas. Criar relatórios personalizados, tabelas dinâmicas e acompanhar indicadores.

**QUANDO IMPLANTAR**

Após os principais módulos operacionais, com dados já cadastrados e movimentações realizadas.

**CHECKLIST DE VALIDAÇÃO**

- [ ] Criar relatório com informações do sistema
- [ ] Aplicar filtros, agrupamentos e totais
- [ ] Usar tabelas dinâmicas
- [ ] Consultar informações de diferentes módulos
- [ ] Exportar em Excel, PDF ou CSV
- [ ] Compartilhar relatórios

## 14. Tarefas


**OBJETIVO**

Organizar e acompanhar atividades das equipes. Controlar responsabilidades, prazos e andamento através de quadros visuais.

**QUANDO IMPLANTAR**

Após os processos que utilizarão o gerenciamento de atividades (Projetos e Obras, CRM, etc.).

### FLUXO OPERACIONAL

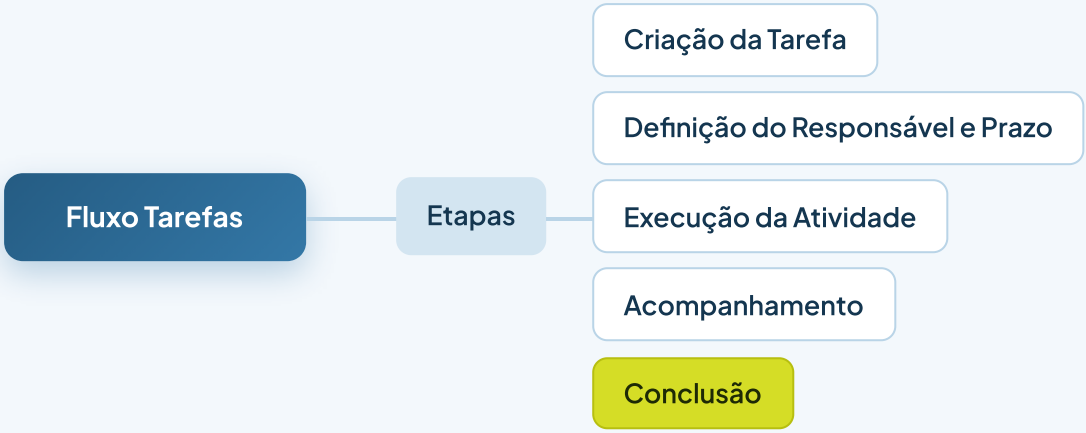


### CHECKLIST DE VALIDAÇÃO

- [ ] Criar quadros e organizar tarefas por etapas
- [ ] Criar cartões com responsáveis, prazos e prioridades
- [ ] Usar checklists e comentários
- [ ] Acompanhar atividades pendentes e atrasadas
- [ ] Consultar tarefas por usuário ou equipe
- [ ] Usar modelos para processos repetitivos

## 15. Alumina (IA) REVER


### OBJETIVO

Assistente inteligente dentro do Faktory Flow. Consultar informações, realizar análises e executar ações por comandos em linguagem natural (texto ou voz).

### QUANDO IMPLANTAR

Após os principais módulos operacionais, com dados suficientes para consultas.

## FLUXO OPERACIONAL

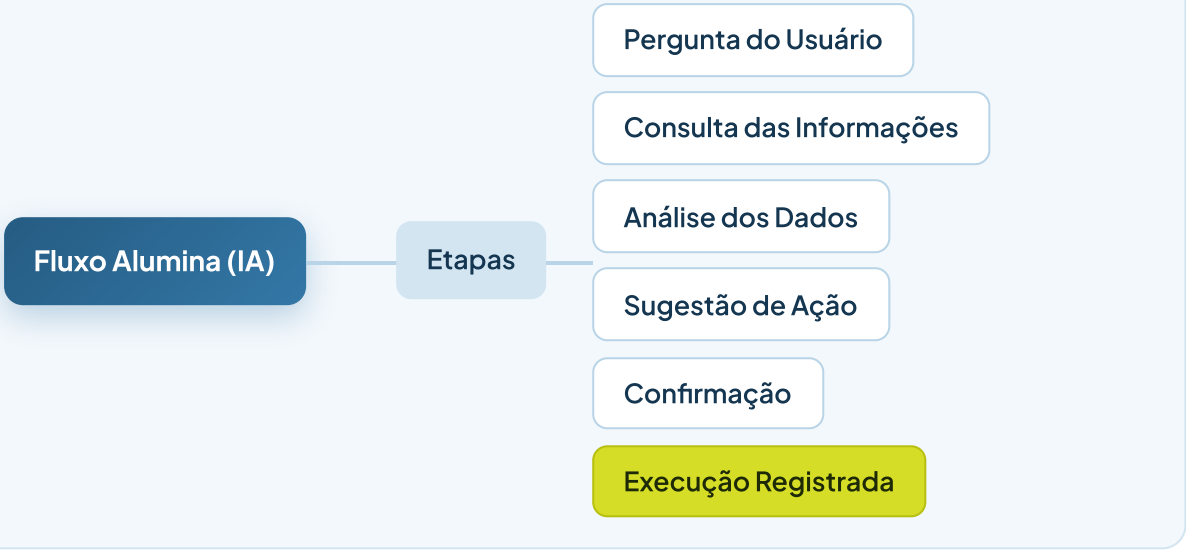


## CHECKLIST DE VALIDAÇÃO

- [ ] Realizar perguntas por texto ou voz
- [ ] Consultar informações dos módulos
- [ ] Interpretar respostas e gráficos
- [ ] Solicitar sugestões de ações
- [ ] Compreender processo de confirmação
- [ ] Entender permissões e segurança

## ANOTAÇÕES

PARTE VI

# Implantação Completa — Estudo de Caso

Seção em desenvolvimento. Será preenchida com um caso prático completo de implantação, ilustrando a aplicação de todos os conceitos apresentados neste guia.

**EM ELABORAÇÃO**

Esta seção está reservada para um estudo de caso detalhado. O conteúdo será incluído em versões futuras desta apostila.

PARTE VII

# Biblioteca de Processos e Diagnóstico

Desenvolver a visão consultiva do implantador. Compreender os processos de negócio dos clientes, identificar causas de problemas e entender a integração entre os módulos.

## Objetivo da seção

Esta etapa tem como objetivo capacitar o consultor a analisar situações, investigar antes de registrar chamados e orientar o cliente de forma segura e eficiente.

### Biblioteca de Processos


Apresenta o funcionamento esperado dos principais fluxos da empresa dentro do sistema.

### Biblioteca de Problemas

Apresenta uma metodologia de análise para identificar se uma situação é causada por configuração, operação incorreta ou falha do sistema.

## Processo Comercial (CRM e Vendas)

O processo comercial representa o início da jornada do cliente dentro do Faktory Flow. Ele acompanha desde o primeiro contato até a transformação da oportunidade em uma venda efetivada.

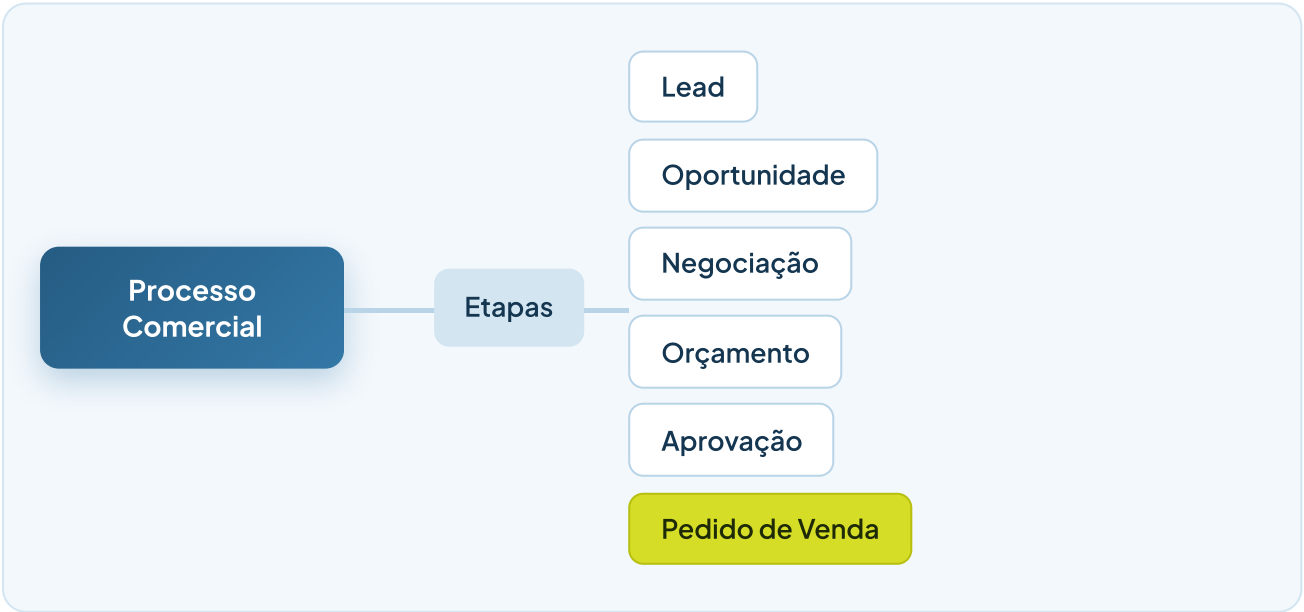

### O que validar na implantação


- Como a empresa recebe novos clientes
- Quem realiza os atendimentos
- Como são feitos os orçamentos
- Quais informações são obrigatórias para aprovação
- Quando um orçamento se transforma em pedido

**PONTOS DE ATENÇÃO**

Evitar criar pedidos antes da aprovação comercial. Garantir que produtos, valores e condições estejam corretamente cadastrados. Validar se as informações da venda serão utilizadas pelos próximos setores.

## Processo de Compras

Garantir que a empresa tenha os materiais necessários para sua operação, mantendo controle sobre solicitações, fornecedores, pedidos e recebimentos.

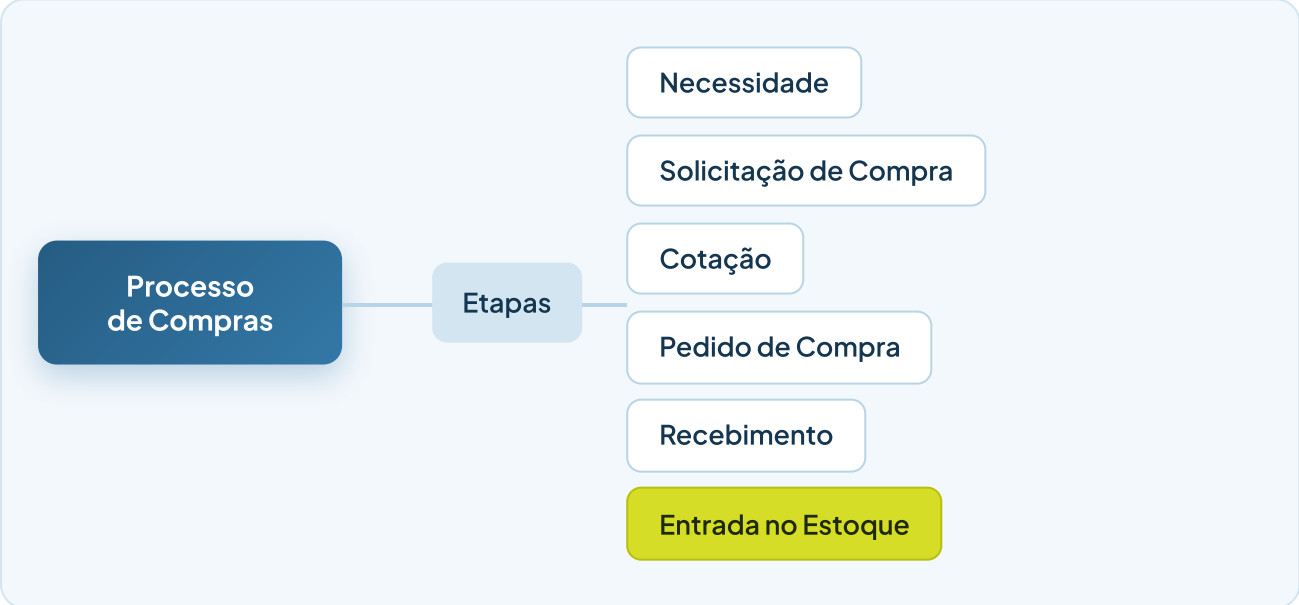



## Processo de Produção

Transformar o pedido aprovado em produto fabricado, garantindo controle das etapas de fabricação e acompanhamento da execução. Em empresas de esquadrias, esse processo envolve perfis, vidros, componentes, corte, montagem e conferência.




## Processo Financeiro

Controlar todas as movimentações relacionadas a pagamentos, recebimentos e acompanhamento do resultado da empresa.

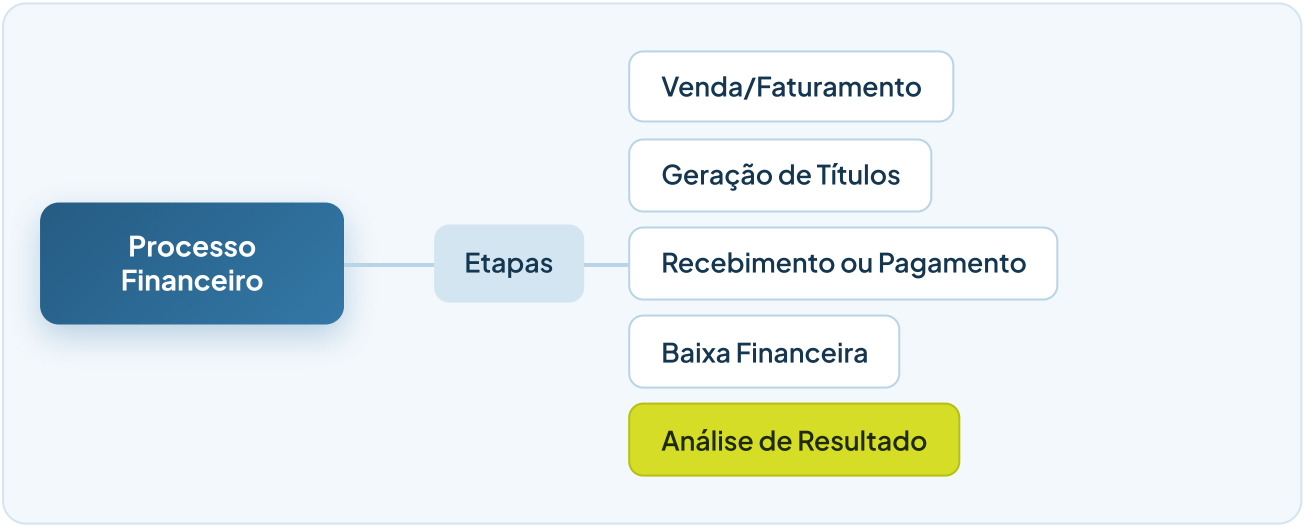


## Processo Fiscal

Garantir que as operações realizadas pela empresa estejam corretamente configuradas para cálculo de impostos e emissão dos documentos fiscais. O módulo Fiscal depende principalmente das informações cadastradas pela empresa e pelo contador.





**IMPORTANTE**

O consultor não define regras tributárias. A configuração deve ser validada pelo responsável fiscal. Erros fiscais geralmente possuem relação com cadastro ou parametrização.


## Processo de Expedição

Controlar o processo de entrega dos produtos ao cliente após a finalização da venda e faturamento.

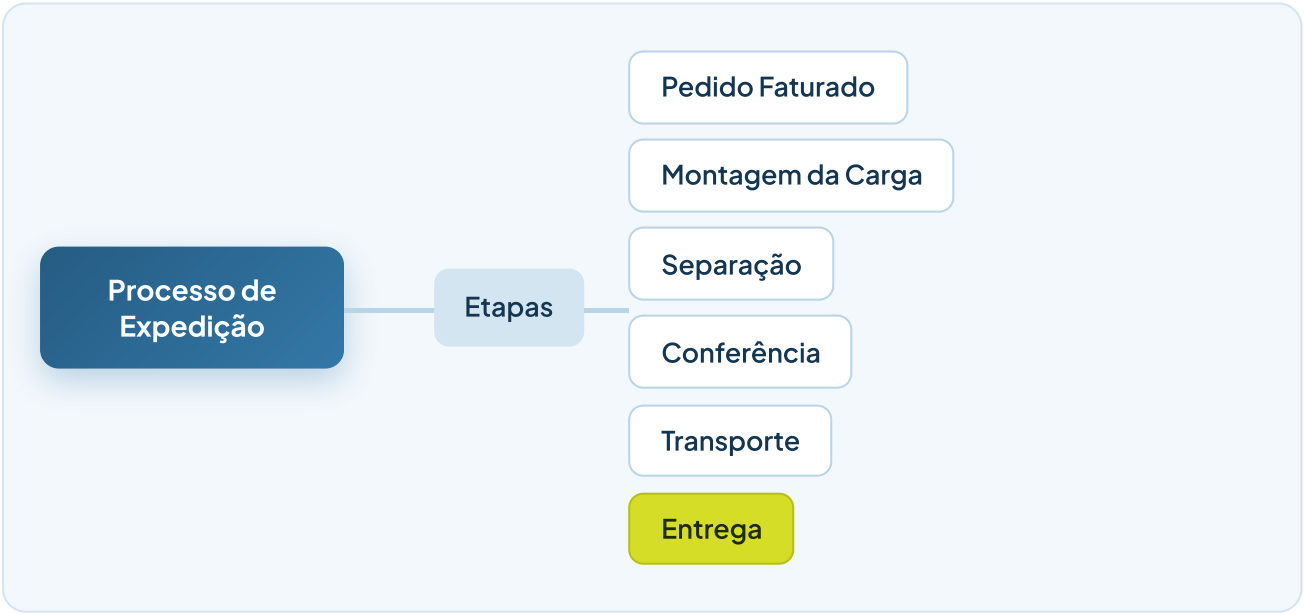

## Processo de Projetos e Obras

Organizar a execução de obras, permitindo acompanhar materiais, custos, produção, serviços e resultado financeiro. A obra passa a ser tratada como um centro de acompanhamento, permitindo identificar se o projeto está dentro do planejado.

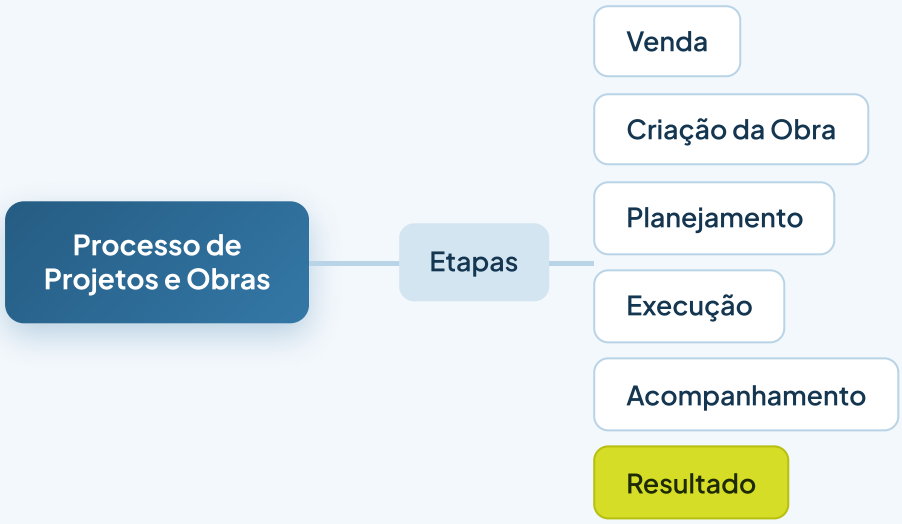


**PONTOS DE ATENÇÃO**

Vincular corretamente vendas e obras. Registrar custos reais. Utilizar diário de obra para histórico.

— ANOTAÇÕES


## Biblioteca de Problemas — Diagnóstico

Durante uma implantação ou operação, o consultor receberá diferentes situações relatadas pelos clientes. Antes de encaminhar um chamado, é necessário realizar uma análise inicial para identificar:

- Se é configuração
- Se é falta de conhecimento do processo
- Se é erro operacional

- Se realmente é um problema do sistema

### Metodologia de Análise do Consultor

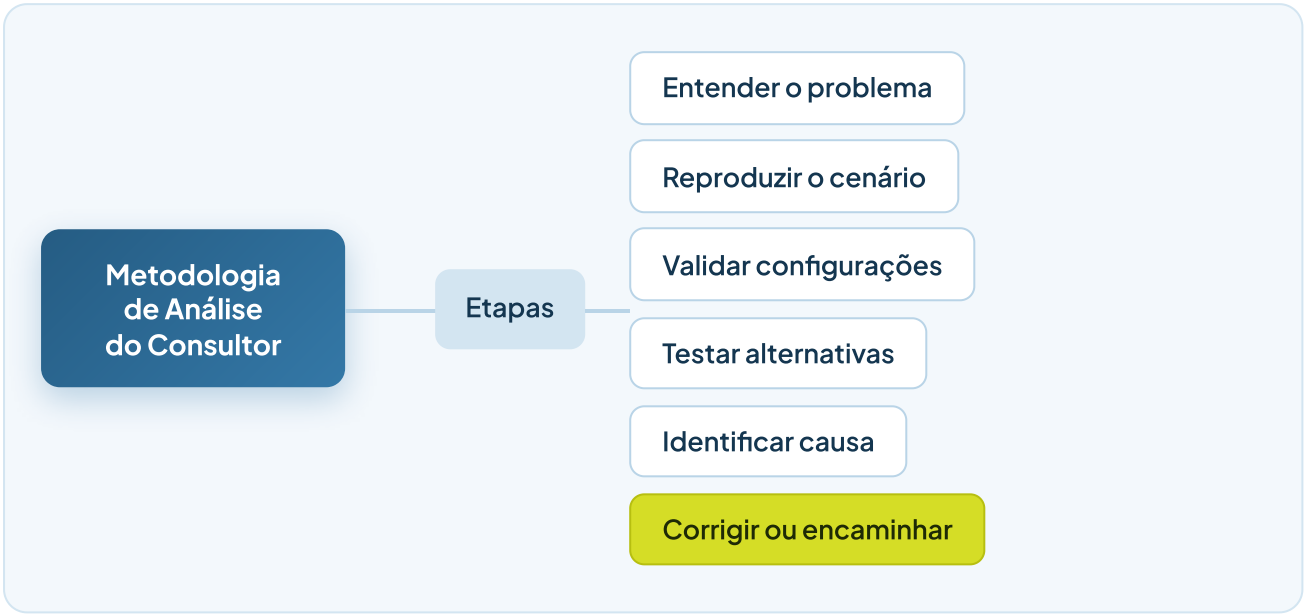


## Exemplo: Cliente não consegue emitir Nota Fiscal

### 1. O que perguntar (entender o cenário)

- Qual nota está tentando emitir?
- Qual mensagem de erro aparece?
- Acontece com todos os pedidos ou apenas um?
- Já conseguiu emitir anteriormente?
- O problema acontece em homologação ou produção?

## 2. Onde olhar (verificar configurações)

| ÁREA | O QUE VERIFICAR |
|---|---|
| **Produto** | Possui NCM? Possui tributação? Está corretamente configurado? |
| **Cliente** | CNPJ correto? Inscrição estadual? Endereço? |
| **Fiscal** | CFOP? CST/CSOSN? Série da nota? Certificado digital? |

## 3. Como validar (realizar testes)

- Conferir cadastro do produto
- Conferir dados fiscais
- Criar nova operação
- Tentar emitir novamente
- Comparar com outro produto ou cliente

**LEMBRE-SE**

Sempre seguir: entender o problema → reproduzir o cenário → validar configurações → testar alternativas → identificar causa → corrigir ou encaminhar.

CONCLUSÃO

# Encerramento do Guia

Os pilares de uma implantação estruturada e o papel transformador do consultor.

## Os quatro pilares

### Conhecimento dos Módulos

Entender como cada área se conecta, do primeiro contato comercial à entrega e análise de resultados.

### Compreensão dos Processos

Implantar respeitando a realidade operacional do cliente, evitando replicar telas sem gerar valor.

### Análise de Problemas

Identificar a causa antes de encaminhar. Postura consultiva e eficiente, diferenciando configuração, operação e bug.

### Comunicação Organizada

Registrar decisões, acompanhar pendências, formalizar entregas e manter o cliente alinhado durante todo o projeto.

## O papel do consultor

A implantação de um sistema não consiste apenas em apresentar funcionalidades ou ensinar o uso das telas. O papel do consultor é compreender a operação do cliente, traduzir seus processos para dentro do sistema e garantir que a ferramenta seja utilizada de forma correta e eficiente.

O consultor de implantação deve ser visto como o **elo entre o cliente e a tecnologia**. Seu objetivo não é apenas colocar o sistema para funcionar, mas **conduzir uma transformação na forma como a empresa trabalha**, garantindo organização, controle e evolução dos processos através do Faktory Flow.

**LEMBRE-SE SEMPRE**

O sucesso de uma implantação não é medido pela quantidade de reuniões realizadas, mas pela **capacidade do cliente de utilizar o Faktory Flow com autonomia, segurança e confiança em seus processos**.

## ANOTAÇÕES FINAIS




# Fim da Apostila

Este material é de uso interno e foi desenvolvido para capacitar consultores de implantação do Faktory Flow. Em caso de dúvidas ou sugestões de melhoria, entre em contato com a equipe responsável.

**Apostila do Consultor**

Versão 1.0 · 2025

Material de uso interno
